



Contraloría Ciudadana
Guadalajara




Gobierno de
Guadalajara

27 SEP 2023
14040

RECIBIDO

Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana



4 3 3 4 '23 SEP 27 P12 :38



Oficialía de Partes
Dirección de Obras Públicas

CONTRALORÍA CIUDADANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

ORDEN DE AUDITORÍA: AOPG-051/2022

OFICIO: DA/211/2023

ASUNTO: Se remite Cédula de Seguimiento y se notifica conclusión de Auditoría.

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
P R E S E N T E.

AT'N: MTRO. GERARDO MOJICA ALMANZOR.
JEFE DE AUDITORÍA DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA DE OBRAS PÚBLICAS DE GUADALAJARA.

A través del presente me permito enviarle un cordial saludo; asimismo, aprovecho este medio para hacer de su conocimiento que el pasado **31 de agosto del año en curso**, mediante el oficio **DA/158/2022**, le fue notificado el Informe correspondiente a la Orden de Auditoría **AOPG-051/2022** practicada a la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara con el propósito de verificar el apego y cumplimiento de la normatividad aplicable respecto a la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO."** relativa al contrato **"DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22"**, adjudicada a la empresa **"ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECAÁNICA S.A. DE C.V."**, documento a través del cual se hizo llegar **01 (UNA) observación física** resultante del proceso de Auditoría.

Bajo este contexto, el pasado **13 y 22 de septiembre del 2023**, a través del oficio **ACSOP/EQP/188/2023** y **DOP/1024/2023** respectivamente, se recibieron por parte de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara, diversos documentos tendientes a subsanar la observación señalada.

En este sentido, después de haber realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recibida, a efecto de verificar la atención de la recomendación emitida y solventar la observación señalada como resultado de la Auditoría, el Auditor Responsable, ha determinado lo siguiente:

No.	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	Diferencia de volumen en el Concepto DOP-042 de la Estimación 06 Finiquito "PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2".	SOLVENTADA

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.
33 3069 1300 Ext. 1305

JERR



**Contraloría
Ciudadana**
Guadalajara



Por tal motivo, siendo atendidas las recomendaciones derivadas de las observaciones resultantes, se da por concluida la presente Auditoría **SIN OBSERVACIONES POR SOLVENTAR** y se ordena el archivo definitivo del expediente de Auditoría **AOPG-051/2022** como asunto concluido, otorgándole un término de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción del presente, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9° fracción II y 10 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 205 y 206 fracciones III, IV, VI y VII del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; los artículos 108 numeral 2, 110 numeral 2, 111 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara; el artículo Segundo Transitorio de los Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Guadalajara y demás relativos de la normatividad aplicable.

Sin otro particular de momento me despido, quedando a sus órdenes y reiterándole mi más atenta y distinguida consideración.

Cordialmente,

Guadalajara, Jalisco a 26 de septiembre de 2023

“2023, AÑO DEL PRIMER CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL HEROÍCO CUERPO DE BOMBEROS DE GUADALAJARA”


**ALFONSO HERNÁNDEZ GODÍNEZ,
DIRECTOR DE AUDITORÍA.**


**ING. EDUARDO ROMERO GARCÍA,
AUDITOR RESPONSABLE.**

C.c.p. Archivo.

Av. 5 de febrero 249, U.A. Reforma, Col. Las Conchas,
C.P. 44460, Guadalajara, Jalisco, México.
33 3609 1300 Ext. 1305

JERR

FECHA DE ELABORACIÓN	26/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-051/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22		

A. OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

OBJETO: Promover y verificar que, tanto la obra pública, como los servicios relacionados con la misma, contratados por el Gobierno Municipal de Guadalajara se realicen de conformidad con los principios de austeridad, honestidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

ALCANCE: verificar que el proceso de ejecución de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO**" relativa al contrato "**DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22**", se ajuste a lo establecido, tanto en el contrato celebrado para tal fin, como en la normatividad aplicable y vigente.

B. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA.	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.
MONTO DEL CONTRATO.	\$12'882,528.41 (Doce millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos veintiocho pesos 41/100 m.n.) I.V.A. incluido.
DÍAS DE EJECUCIÓN.	306 días naturales.
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.	27 de abril del 2022
PERIODO AUDITADO.	Del 27 de abril del 2022 al 26 de febrero del 2023.

C. ANÁLISIS

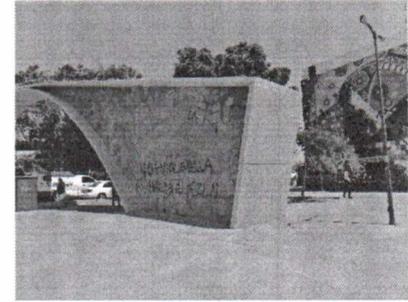
Atendiendo a la Cédula de Observaciones correspondiente a la orden de auditoría **AOPG-051/2022**, notificada el pasado **31 de agosto del año 2023** ante la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara mediante el oficio **DA/158/2023**, se procedió a realizar la revisión y análisis del total de las acciones implementadas por la Unidad Auditada a efecto de atender las recomendaciones derivadas del proceso de auditoría, resultando lo siguiente:

1. OBSERVACIÓN.

TIPO.	<input type="checkbox"/> DOCUMENTAL	<input checked="" type="checkbox"/> FÍSICA
TÍTULO.	Diferencia de volumen en el Concepto DOP-042 de la Estimación 06 Finiquito "PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=200 KG/CM2".	
DESCRIPCIÓN.	Derivado de la confrontación de la información recibida el pasado 30 de mayo del año 2023 mediante el oficio ACSOP/EST/436/2023 correspondiente a la Estimación 06 Finiquito, contra los volúmenes ejecutados revisados en la Cuarta Visita de Inspección al sitio de la obra realizada el 21 de junio del 2023 , no fue posible identificar la ejecución del concepto DOP-042, ya que no se detectó la construcción de banquetas de concreto premezclado.	
		

FECHA DE ELABORACIÓN	26/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-051/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22		

Imágenes de referencia tomadas el **26 de julio de 2022** correspondientes a ambas aceras de la Av. Alcalde, donde se aprecia el estado que guardaban las banquetas al inicio de la obra.



Imágenes de referencia tomadas el **30 de mayo del 2023** correspondientes a ambas aceras de la Av. Alcalde, donde se aprecia que no fueron intervenidas las banquetas.

DISPOSICIÓN INCUMPLIDA.

- Artículo 105 Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Artículo 2, fracción XIV, 133 fracciones I, VI, IX y X, del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios
- Artículos 5 y 49 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y servicios Relacionados con la misma del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

\$20,835.28 (Veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 28/100 m.n.) I.V.A. incluido.

MONTO POR ACLARAR.

CONCEPTO	ESTIMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN EJECUTADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO POR ACLARAR
DOP-042	06 FINIQUITO	PZA	1.00	0.00	1.00	\$17,961.45	\$17,961.45
SUBTOTAL							\$17,961.45
IVA							\$2,873.83
TOTAL							\$20,835.28

RECOMENDACIÓN CORRECTIVA SEÑALADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES.

"La Dirección de Obras Públicas de Guadalajara deberá proporcionar, mediante oficio, evidencia suficiente que demuestre las acciones realizadas por la empresa contratista a fin de comprobar la ejecución del concepto y volumen observado.

RECOMENDACIÓN PREVENTIVA SEÑALADA EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES.

O bien, remitir los documentos que acrediten el reintegro del monto correspondiente al concepto observado, respecto de la diferencia de volumen señalado, más el monto de los intereses o cargas financieras que al efecto calcule la Tesorería Municipal -previa solicitud por escrito por parte de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara-, contemplando el plazo desde la fecha en que se realizó el pago hasta su reintegro, conforme lo establecido en el artículo 105, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios."

ACCIONES REALIZADAS.

"Girar instrucciones al área encargada de la supervisión de obra, a efecto de que monitoreen y verifiquen que los trabajos y volúmenes estimados estén ejecutados física y materialmente en el sitio de la obra, evitando autorizar estimaciones de conceptos no ejecutados."




La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara remitió los oficios **ACSOP/EQP/188/2023** y **DOP/1024/2023** recibidos en esta Contraloría Ciudadana el **13 y 22 de septiembre del 2023** respectivamente, a través de los cuales hace de nuestro conocimiento que existió un error en la redacción del concepto DOP-042 propiciado por el sistema, ya que se traslapó con el nombre del concepto siguiente, por lo que el nombre correcto del concepto es: "PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN

FECHA DE ELABORACIÓN	26/09/2023	ORDEN DE AUDITORÍA	AOPG-051/2022
DEPENDENCIA AUDITADA	Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara		
CONTRATO	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22		

	MARCHA DE CONTROL GENERAL DE ALUMBRADO EN PISO Y PUENTE, INCLUYE: CUADRILLA, PROGRAMADOR ESPECIALIZADO EN SISTEMAS DE ALUMBRADO, COMPUTADORA PARA CONFIGURACIÓN DE TABLERO GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN"; asimismo, remitió copia simple de la análisis del precio unitario, catálogo de conceptos, generador y croquis de ubicación de los trabajos realizados.		
EVIDENCIA Y/O ANEXOS.	Copia simple del catálogo de conceptos, análisis de precios unitarios, generador y croquis del generador.		
CONCLUSIÓN.	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVENTADA	<input type="checkbox"/> NO SOLVENTADA	

D. MONTOS TOTALES	
MONTO AUDITADO:	\$12'882,528.41 (Doce millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos veintiocho pesos 41/100 m.n.) I.V.A. incluido.
MONTO ESTIMADO:	\$12'881,734.00 (Doce millones ochocientos ochenta y un mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) I.V.A. incluido.
MONTO ACLARADO:	\$20,835.28 (Veinte mil ochocientos treinta y cinco pesos 28/100 m.n.) I.V.A. incluido.
MONTO POR CANCELAR:	\$794.41 (Setecientos noventa y cuatro pesos 41/100 m.n.) I.V.A. incluido.

E. CONCLUSIÓN	
TOTAL DE OBSERVACIONES REALIZADAS.	01
TOTAL DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS.	01
TOTAL DE OBSERVACIONES SIN SOLVENTAR.	00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Eduardo Romero García AUDITOR RESPONSABLE	  Jaime Eduardo Reyes Robles JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Contraloría Ciudadana	 Alfonso Hernández Godínez DIRECTOR DE AUDITORÍA



**Obras
Públicas**
Gestión Integral
de la Ciudad



13 SEP 2023
Maqo 12:28
RECIBIDO
Contraloría Ciudadana
Guadalajara



ANEXOS

DOCUMENTOS ca CD X
Se recibe la documentación a reserva
de verificar su contenido
Contraloría Ciudadana

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE GUADALAJARA
DEPARTAMENTO DE EQUIPAMIENTO
OFICIO NO. ACSOP/EQP/188/2023
CC. 3825/2023**

003653

C. ALFONSO HERNANDEZ GODINEZ.
DIRECTOR DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y con respecto al informe de la auditoría practicada a la obra: "CONSTRUCCION DE ELEMENTO Y PIEZA ICONICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUNTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AVE. ALCALDE Y AVE. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO." con número de contrato: "DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22" adjudicada a la empresa: "ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V."

De acuerdo al expediente AOPG-051/2022, DERIVADO DE LA REVISION DOCUMENTAL Y NORMATIVA, se da por terminada pero con la salvedad de una observación física en el concepto DOP-042, donde se señala que no se detectó la construcción de banquetas de concreto premezclado, de acuerdo al concepto señalado, el cual a la letra dice: PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, corresponde a la partida eléctrica de la obra, relacionado con el sistema de alumbrado.

Dicho concepto está en el catálogo desde concurso, por lo cual sí correspondería a lo realizado y cobrado en la estimación de finiquito, anexando para ello copia del concepto y análisis, generador, ubicación y catálogo de conceptos correspondiente.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"2023, AÑO DEL PRIMER CENTENARIO DE LA
FUNDACION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
DE GUADALAJARA"
GUADALAJARA, JAL., SEPTIEMBRE 11, 2023



MTR. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Ing. Eduardo Romero García Auditor Responsable
Ing. Gerardo Mojica Almanzor Jefe de Auditoria de la Dirección Jurídica de OPG
Ing. Juan Carlos Navarro Ruiz.- Titular del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública
de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara
Departamento de Equipamiento
Supervisión.- Ing. Víctor Manuel Legorreta Núñez
Oficialía de Partes

Hospital 502, Col. El Retiro, CP 44100,
Guadalajara, Jalisco, México
3637 50 00

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2019
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

No. CONS.	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR.	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
335	01/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 133-17 TERCOSA	1265	280	JUAN MANUEL	se entregaron observaciones al contratista (Jorge Christian martinez)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
336	01/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 088-16	1264	278	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
337	01/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 253-16 GRUPO EMPORIC	1263	279	JUAN MANUEL	se entregaron observaciones al contratista (Aldo F. Godínez)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
338	28/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 084-16 DESARROLLADORES MARSOL	1217	270	JUAN MANUEL	se entregaron observaciones al contratista	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
339	27/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 100-17 AZTECH	1160	260	HUGO BASS	se entregaron observaciones al contratista (Carlos M) EQP/265/19	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
340	27/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 011-18 ANITSUJ	1159	259	CARLOS CASTELLANCS	se entregaron observaciones al contratista (sergio marcado)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
341	27/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 134-17 MEGAFNLACE	1158	258	JUAN MANUEL	se entregaron observaciones al contratista	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
342	27/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 091-18	1157	257	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
343	25/02/2019	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	SOLICITAN REVISION DE CONECTIVIDAD DE DRENEJE DE PRESCOLARES EN LA COL. HELIDRO HERNANDEZ LOZA	1113	241	TURNADO A IPEJAL	CONTESTADO	EQP/147/19	ARCHIVO
344	25/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 254-16 ALTHEN	893	192	JUAN MANUEL	se entregaron observaciones al contratista (Fabricio)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
346	21/02/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA 255-16 INGENIERIA Y EDIFICACIONES	1080	226	HERIBERTO	se entregaron observaciones al contratista	EQP/106/19	ARCHIVO
347	20/02/2019	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	SOLICITAN AUTORIZACION PARA REALIZAR VISITA DE CARACTER TECNICO INSTALACIONES DE PARQUE LAZARO CARDENAS	930	209	VICTOR LEGORRETA	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22		 <p>Obras Públicas Gestión integral de la Ciudad</p>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022 FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de febrero de 2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10.06 Meses)		
	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. JALISCO.		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		

DOCUMENTO
E2

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
PDA 1 PRELIMINARES						
DOP-001	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	205.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-002	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS	M3	49.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-003	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00), ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	91.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-004	ACARREO EN CAMIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00), DEMOLICIÓN DE RODAPIE DE MAMPOSTERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DENTRO Y FUERA DE LA	M3/KM	611.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-005	DEMOLICIÓN DE RODAPIE DE MAMPOSTERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DESMANTELAMIENTO DE REJA DE HERRERÍA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, TRASLADOS A SITIO INDICADO PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M3	18.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-006	DESMANTELAMIENTO DE REJA DE HERRERÍA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, TRASLADOS A SITIO INDICADO PARA SU RETIRO POSTERIOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: GUARNICIÓN, ACARREO LIBRE AL BANCO UBICADO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-007	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: GUARNICIÓN, ACARREO LIBRE AL BANCO UBICADO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	M3	8.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-008	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	ML	54.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
TOTAL PRELIMINARES						
PDA 2 CIMENTACION						
DOP-009	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2, ENCIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES, AMARRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #4 (1/2") F'Y=4200 KG/CM2, ENCIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES.	KG	565.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2019
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

No. CONS.	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
139	15/07/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES OT. 159-18 IMEX	4623	1161	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
140	11/07/2019	DIRECCION DE PROYECTOS	INFORMAN QUE INICIA LA 3RA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LUDOTECA CAMUNITARIA DEL DIF		1149	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	BAJA	ARCHIVO
141	11/07/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES OT. 039-17 ALTHEN	4547	1139	JUAN MANUEL	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
142	11/07/2019	COMKRETE	RESPUESTA A OBSERVACIONES CONTRALORIA OT. 103-18	4555	1142	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
143	10/07/2019	JEFATURA DE GABINETE PRESIDENCIAL	SOLICITAN EVALUEN Y DETERMINE, LA VIABILIDAD DE LO SOLICITADO, TRABAJOS QUE QUEDARON INCONCLUSOS EN LA PLAZOLETA UBICADO CALLE JOSE VELAZCO Y LA AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	4307	1078	JUAN MANUEL	ATENDIDO	BAJA	ARCHIVO
144	10/07/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES OT. 250-16 FORMER	4514	1134	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
145	10/07/2019	COMISION EDILICA DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	EMITA OPINION TECNICA DEL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA REALIZAR OBRA DE RESCATE O MEJORAMIENTO DEL MERCADO ECHEVERRIA	4506	1129	JUAN MANUEL Y ELIAS	ELABORAR CATALOGO DE NECESIDADES	BAJA	ARCHIVO
146	10/07/2019	COMISION EDILICA DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	EMITA OPINION TECNICA DEL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA REALIZAR OBRA DE RESCATE O MEJORAMIENTO DEL MERCADO JOSE CLEMENTE OROZCO	4505	1128	JUAN MANUEL Y ELIAS	ELABORAR CATALOGO DE NECESIDADES	BAJA	ARCHIVO
147	10/07/2019	COMISION EDILICA DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO	EMITA OPINION TECNICA DEL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA REALIZAR OBRA DE RESCATE O MEJORAMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	4504	1127	JUAN MANUEL Y ELIAS	ELABORAR CATALOGO DE NECESIDADES	BAJA	ARCHIVO
148	09/07/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES OT. 109-17 LEVISA	4475	1119	VICTOR LEGORRETA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
149	09/07/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES OT. 072-18 SE INGENIEROS	4474	1118	VICTOR LEGORRETA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION: 26 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10.06 Meses)

DOCUMENTO
E2

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-010	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #4 (1/2") F'Y=4200 KG/CM2, ENCIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES,AMARRRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #5 (5/8") F'Y=4200 KG/CM2, ENCIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES,	KG	631.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-011	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #5 (5/8") F'Y=4200 KG/CM2, ENCIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES,AMARRRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN CIMENTACION,INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS,	KG	1,139.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-012	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN CIMENTACION,INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTACIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO,CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA,	M3	93.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-013	CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO,CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA.LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.PERFORACION DE 40 CM. DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOSMICROPILOTE PREFABRICADO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, DE 40 CM. DE DIAM.	M2	124.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-014	PERFORACION DE 40 CM. DE DIAMETRO POR MEDIOS MECANICOSMICROPILOTE PREFABRICADO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, DE 40 CM. DE DIAM.Y 6.00 M DE LINGITUD REFORZADO CON 12 VAR. #6 (3/4") Y ZUNCHO DE VAR. #3 CONSEPARACIONES DE 10 CM.PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:	ML	405.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-015	MICROPILOTE PREFABRICADO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, DE 40 CM. DE DIAM.Y 6.00 M DE LINGITUD REFORZADO CON 12 VAR. #6 (3/4") Y ZUNCHO DE VAR. #3 CONSEPARACIONES DE 10 CM.PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO	PZA	82.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-016	PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA.RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO. (ARENALIMOSA, TEPETATE, ETC.) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM.	M2	30.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-017	RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, (ARENALIMOSA, TEPETATE, ETC.) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM.MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDADOPTIMA, DESPERDICIOS, TENDIDO, TRASPALEOS, EQUIPO, PRUEBAS DECOMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO	M3	17.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
	TOTAL CIMENTACION					\$ -
PDA 3	ELEMENTOS DE CONCRETO COLADO EN SITIO					

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2019
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

No. CONS	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
82	01/10/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBRA AUDITADA 035-16	6390	1546	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
83	26/09/2019	AMICUM	RESPUESTA A OFICIO ACSOP/07/2019 REFERENTE AL PARQUE LOS VENADOS OBRA 145-18	6372	1540	LUIS GUERRERO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
84	26/09/2019	PARTICIPACION CIUDADANA	ENVIAN OFICIO A ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO DE JALISCO	6311	1525	MARCO POLO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
85	25/09/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBRA 250-16 FALTA BITACORA ELECTRONICA	6248	1507	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	BAJA	ARCHIVO
86	25/09/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBRA 205-16 FALTA BITACORA ELECTRONICA	6241	1500	FERNANDO GARCIA	ATENDIDO	BAJA	ARCHIVO
87	20/09/2019	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	REFERENTE AL LOS OFICIOS EQP/245/2019 Y EL EQP/275/2019	6179	1491	ARCHIVADO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
88	19/09/2019	FUNCION PUBLICA	PAGO EN EXCESO (CONSEPTO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.	DOP/11 06/2019	ACSOP/12 3/2019	ESCRITORIO MARCO POLO	LA CONTESTACION LA HIZO EL ING. GEPARDO MOJICA OFICIO DOP/1108/19	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
89	11/09/2019	TESORERIA GUADALAJARA	SOLICITAN INTERVENCION PARA QUE SE REALICE UNA REVISION Y DICTAMEN DE LA PLANTA BAJA (OFICINA RECAUDADORA) EDIFICIO TESORERIA	5974	1463	JUAN MANUEL	ATENDIDO POR SERVICIOS GENERALES LO REVISO	BAJA	ARCHIVO
90	11/09/2019	TECNOLOGIA INGENIERIA CIVIL	EN RELACION A RESPUESTA POR PARTE DE EMPRESA AL OFICIO DA/596/2019 DE LA OBRA 205-16	5961	1454	MARCO POLO	SE ENTREGO AL LIC. MARIO CHAVARIN	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
91	28/08/2019	MERCADOS SERVICIOS MUNICIPALES	RESOLUCION DE REVOCACION AL LOCAL 20 DEL MERCADO IV CENTENARIO	5709	1403	ERNESTO MEDINA	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
92	26/08/2019	ALUMBRADO PUBLICO	EN ATENCION A EQP/234/2019 SOBRE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO.	5696	1399	LUIS GUERRERO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION: 26 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10 06 Meses)

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

DOCUMENTO
E2

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS:

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-018	CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN ESTRUCTURA, A BASE DECIMBRAPLAY DE 16 MM (3 USOS MAXIMO), PARA MUROS Y COLUMNAS, LIMPIAR PERFECTAMENTE EN CADA USO. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIAJE, HABILITADO, DESMOLDANTE, COLOCACION, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EQUIPO.	M2	294.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-019	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES, AMARRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #4 (1/2") F'Y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES.	KG	1,613.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-020	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #4 (1/2") F'Y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES, AMARRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #5 (5/8") F'Y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES.	KG	1,804.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-021	ACERO DE REFUERZO VARILLA CORRUGADA #5 (5/8") F'Y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DOBLECES, ELEVACIONES, AMARRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS.	KG	3,259.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-022	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RECUBRIMIENTO DE PIEDRA BRAZA CORTE LAJA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA PROPORCION 1:3, A UNA ALTURA DE HASTA 9.00 M.	M3	239.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-023	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA BRAZA CORTE LAJA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-ARENA PROPORCION 1:3, A UNA ALTURA DE HASTA 9.00 M. INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTROS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, FRSPRDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	453.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
TOTAL ELEMENTOS DE CONCRETO COLADO EN SITIO						\$ -
CAJONES Y LOSAS PREFABRICADOS DE CONCRETO EN ARCO						
DOP-024	SUMINISTRO DE CAJON SEMI-ARCO (D) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 1.00 A 0.53M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 2.50 M. DE LONGITUD, SECCION COMPUESTA POR DOS MUROS DE 30 CM. LOSA TAPA DE 2.50X 0.15 M Y LOSA BASE DE 2.50 X 0.17 M. EN EXTREMOS Y 0.41 M. AL CENTRO. REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. AMBAS CARAS Y ESTRIBOS DEL VAR. #3	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-025	SUMINISTRO DE CAJON SEMI-ARCO (A) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 3.45 A 2.59 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 1.50 M. DE LONGITUD, SECCION COMPUESTA POR DOS MUROS DE 30 CM. LOSA TAPA DE 2.50X 0.15 M Y LOSA BASE DE 2.50 X 0.20 M. EN EXTREMOS Y 0.49 M. AL CENTRO. REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. AMBAS CARAS Y ESTRIBOS DEL VAR. #3	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2019
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

No. CCNS	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR.	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACION DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
23	13/11/2019	EDUCACION CONSTRUCCION DE COMINIDA	SOLICITAN APOYO DE CONTRUCCION DE DOS RAMPAS DE ACCESO PARA LA ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL.	6856	1863	JUAN MANUEL	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
24	12/11/2019	JUSTICIA MUNICIPAL	SOL. INTERVENCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EDIFICIO CALZADA INDP.	7484	1853	ISAAC CARBAJAL	CONTESTADO	EQP/340/2019	ARCHIVO
25	12/11/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	INFORME FINAL DE AUDITORIA OBSERCCIONES OBRA 097-17 GRUPO INMOBILIARIO CCR	7460	1843	CARLOS DE LA MORA	ESTE ASUNTO LO ESTA ATENDIENDO EL ARQ. VICTOR VELAZCO 16/12/2019	EQP/350/19	ARCHIVO
26	08/11/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	INFORME FINAL DE AUDITORIA OBSERCCIONES OBRA 244-17 ANITSUJ	7403	1826	MAGDALENO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
27	08/11/2019	DIRECCION DE PROYECTOS	NOS INFORMAN QUE SE CUENTAN CON RECURSOS ADICIONALES DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33		D.P.G.R. 644/2019	ESCRITORIO MARCO POLO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
28	08/11/2019	PRESUPUESTOS Y CONTRATOS	RESPUESTA REFERENTE AL OFICIO EQP/321/2019 SOBRE EL DOMICILIO DE LA OBRA 077-16 (OBSERVACIONES)		PYO/1258/2019	MARCO POLO	CONTESTADO	EQP/330/2019	ARCHIVO
29	07/11/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	INFORME FINAL DE AUDITORIA OBSERVACIONES OBRA 181-18 SKIP EDIFICACIONES	7400	1826	SALVADOR ZAMORANO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
30	07/11/2019	XOLOT	RESPUESTA AL OFICIO DA/1273/2019 DE LA OBRA 081-14	7377	1818	MARCO POLO	ASUNTO LO ESTA LLEVANDO EL ARQ. VICTOR VELAZCO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
31	06/11/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	INFORME FINAL DE AUDITORIA OBSERVACIONES OBRA 029-19 CONSTRUCTORA MONTE.	7267	1796	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
32	06/11/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	INFORME FINAL DE AUDITORIA OBSERVACIONES OBRA 160-18 LACARIERE EDIFICACIONES	7263	1792	SALVADOR ZAMORANO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
33	06/11/2019	MERCADOS SERVICIOS MUNICIPALES	SOLICITAN COPIA SIMPLE ACTA ENTREGA RECEPCION OBRA MERCADO CORONA	7246	1816	VICTOR LEGORRETA	CONTESTADO	EQP/356/19	ARCHIVO
34	04/11/2019	GESTION INEGRAL DE LA CIUDAD	PLACA "PANCHITO" PARQUE WALT DISNEY	7163	1808	EDUARDO DE LA PEÑA	CONTESTADO	EQP/328/2019	ARCHIVO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION: 26 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10 06 Meses)

DOCUMENTO

E2

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-026	SUMINISTRO DE CAJON SEMI-ARCO (B) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 2.59 A 1.79 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 1.90 M. DELONGITUD, SECCION COMPUESTA POR DOS MUROS DE 30 CM. LOSA TAPA DE 2.50X 0.15 M Y LOSA BASE DE 2.50 X 0.19 M. EN EXTREMOS Y 0.46 M. AL CENTRO,REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. AMBAS CARAS Y ESTRIBOS DEL VAR. #3	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-027	SUMINISTRO DE LOSA SEMI-ARCO (E) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 0.53 A 0.40 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 3.00 M. DELONGITUD, SECCION COMPUESTA POR LOSA BASE DE 2.50 X 0.30 M. EN EXTREMOS Y 0.53 M. AL CENTRO, REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. LADO TRANSVERSAL Y VAR. #5 CADA 15 CM. LADO LONGITUDINAL. ACABADO EN CONCRETO GRIS A	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-028	SUMINISTRO DE CAJON SEMI-ARCO (C) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 1.79 A 1.00 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 2.50 M. DELONGITUD, SECCION COMPUESTA POR DOS MUROS DE 30 CM. LOSA TAPA DE 2.50X 0.15 M Y LOSA BASE DE 2.50 X 0.17 M. EN EXTREMOS Y 0.43 M. AL CENTRO,REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. AMBAS CARAS Y ESTRIBOS DEL VAR. #3	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-029	SUMINISTRO DE LOSA SEMI-ARCO (F) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 0.40 A 0.38 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 3.00 M. DELONGITUD, SECCION COMPUESTA POR LOSA BASE DE 2.50 X 0.17 M. EN EXTREMOS Y 0.40 M. AL CENTRO, REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. LADO TRANSVERSAL Y VAR. #5 CADA 15 CM. LADO LONGITUDINAL. ACABADO EN CONCRETO GRIS A	PZA	2.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-030	SUMINISTRO DE LOSA SEMI-ARCO (G) DE CONCRETO PREFABRICADO F'C=250KG/CM2, DE 0.38 M. DE ALTURA TOTAL, 2.50 M. DE ANCHO TOTAL Y 2.20 M. DELONGITUD, SECCION COMPUESTA POR LOSA BASE DE 2.50 X 0.15 M. EN EXTREMOS Y 0.38 M. AL CENTRO, REFORZADO CON VAR. #6 CADA 15 CM. LADO TRANSVERSAL Y VAR. #5 CADA 15 CM. LADO LONGITUDINAL. ACABADO EN CONCRETO GRIS A	PZA	1.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-031	MONTAJE DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE HASTA 4.00 M3 SEGUN DISEÑO Y A UNA ALTURA MAXIMA DE 9.00 M. COLOCANDO PIEZAS DE MANERA SIMULTANEA INICANDO EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: HORARIOS NOCTURNOS, TUERCAS PENSADAS, CAPUCHONES, CONECTOR MOVIL CON AMORTIGUADOR DE NEOPRENO DE ALTA DENSIDAD, UNA CAPA DE SELLO HIDROFUGANTE, DOS GRUAS TIPO	M3	71.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-032	ACERO POSTENSADO, PARA ELEMENTOS SEMI-ARCO DE CONCRETOPREMEZCLADO, INCLUYE: SUMINISTRO, PREPARACION, ANCLAJES, EQUIPO HIDRAULICO, CONDUCCIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	2,528.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
TOTAL CAJONES Y LOSAS PREFABRICADOS DE CONCRETO SIN ARCO						\$ -
PDA 5	INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION					
DOP-033	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" (50 MM.) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO. CABLE	ML	102.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -

GOBIERNO DE GUAYACÁN
SECRETARÍA DE DESARROLLO

No CONS.	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR	RESPONSABLE	RESERVACIONES	ESTATUS	UBICACION DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
152	15/01/2020	PROYECTOS	ASIGNACION DE SUPERVISOR	Derechos	108	MARCO POLO	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
163	10/01/2020	CULTURA	SOLICITA DE MANERA URGENTE LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE GUADALAJARA	412	25	AMIRADAB	CONTESTADO	EQP/012/2020	ARCHIVO
164	10/01/2020	GERENCIA MUNICIPAL	SOLICITA ATENCION Y CANALIZACION A DIFERENTES DEPTOS DE LAS PARQUES MARGISTERIAL	87	22	VICTOR LECORRETA	URGENTE	EQP/011/20	ARCHIVO
165	09/01/2020	SINDICATURA	SOLICITA INFORMACION DOCUMENTACION DE LA OBRA 183-18 SAZUJAR	55	13	CARLOS ZAMBRANO	CONTESTADO	EQP/032/2020	ARCHIVO



MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022
FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de febrero de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10 06 Meses)

DOCUMENTO

E2

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-034	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12, CAJAS	SAL	24.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, TAPADE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, RELLENO, FILTRO DEGRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU	PZA	3.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	202.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10, DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PUNTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REFLECTOR 90W RGBW DE RADIO FRECUENCIA OP ELIPTICA MONTADO EN BRACKET	ML	135.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-038	REFLECTOR 90W RGBW DE RADIO FRECUENCIA OP ELIPTICA MONTADO EN BRACKET MODELO LDA148WVEZ, PARA COLOCAR EN PISO EN REGISTRO CON REJILLA ANTIVANDALICA O CRISTAL, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CONSOLA RGBW-DMX 512 CANALES, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE	PZA	20.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-039	CONSOLA RGBW-DMX 512 CANALES, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA PARA TECNOLOGIA RGBW CON CONTROL REMOTO, 110-220 V AC, 16 PROGRAMAS, MODELO LDA14101G, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-040	TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA PARA TECNOLOGIA RGBW CON CONTROL REMOTO, 110-220 V AC, 16 PROGRAMAS, MODELO LDA14101G, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MANGUERA NEON RGBW DE 50 MTS, MOD. NEON GRB, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-041	MANGUERA NEON RGBW DE 50 MTS, MOD. NEON GRB, INCLUYE: SUMINISTROS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	PZA	337.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-042	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,	PZA	1.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
TOTAL INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION						\$ -
PDA 6	OBRA COMPLEMENTARIA					
DOP-043	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2., R.N., T.MA. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NOMAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE:	M2	59.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -

GOBIERNO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

No. CONS.	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CG	NR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	USIACION DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
127	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 179-18	233	96	SERGIO NAVARRO	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
128	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 175-18	233	94	ERNESTO MEDINA	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
129	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 174-18	199	54	SALVADOR ZAMORANO	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
130	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 172-18	199	53	ERNESTO MEDINA	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
131	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 172-18	199	52	ERNESTO HERNANDEZ	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
132	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 174-18	202	65	SERGIO NAVARRO	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO
133	15/01/2020	CONTRALORIA CIUDADANA	OFICIO DE AMPLIACION DE GRUPO DE AUDITORES. OBRA 170-18	201	64	ERNESTO MEDINA	CONOCIMIENTO	BAJA	ARCHIVO

 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		CONTRATO: DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22		 <p>Obras Públicas Gestión Integral de la Ciudad</p>
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		FECHA DE APERTURA: 31 de marzo de 2022 FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de febrero de 2023 PLAZO DE EJECUCIÓN: 306 Días Naturales (10.06 Meses)	DOCUMENTO E2	
	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.		RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:		

CATALOGO DE CONCEPTOS

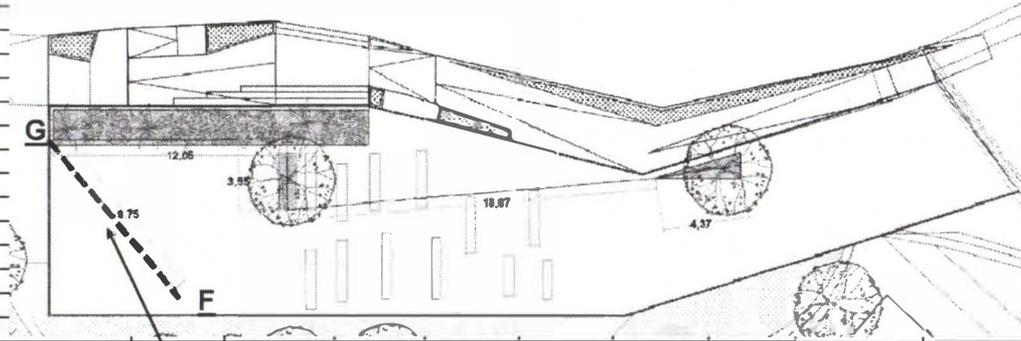
REG.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	TOTAL
DOP-044	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NOMAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE:CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE DOS CARAS DE 0 A 1.50MTS, ASENTADA CON CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES.	M2	59.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-045	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE DOS CARAS DE 0 A 1.50MTS, ASENTADA CON CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES,HERRAMIENTAS, PLOMEO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALESAL SITIO DE SU UTILIZACION.REPISON DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA, CON	M3	18.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-046	REPISON DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA, CONUNA SECCION TRANSVERSAL DE 55 CM. DE ANCHO X 7 CM. DE ESPESOR, ARMADOCON 3 VARILLAS DEL # 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y 1 VARILLA DEL # 3 @ 20 CM.EN SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO,CHAFLANES, COLADO, CURADO, VIBRADO, PERFILADO, DESPERDICIOS, ACABADO	ML	30.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
DOP-047	REPOSICION DE CANCEL DE HERRERIA, DE DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE	Kg	1,166.00		CERO PESOS 00/100 M.N.	\$ -
TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA						\$ -

RESUMEN DE PARTIDAS

PRELIMINARES	\$	-
CIMENTACION	\$	-
ELEMENTOS DE CONCRETO COLADO EN SITIO	\$	-
CAJONES Y LOSAS PREFABRICADOS DE CONCRETO EN ARCO	\$	-
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	\$	-
OBRA COMPLEMENTARIA	\$	-
SUB-TOTAL	\$	-
IMPORTE TOTAL CON LETRA:	Cero Pesos 00/100 M.N.	\$ -
	SUB-TOTAL	\$ -
	16% I.V.A.	\$ -
	TOTAL	\$ -

GENERADORES DE OBRA

ESTIMACION:	06 (SEIS)	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.	 Gobierno de Guadalajara
PERIODO:	DEL 19 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COLMENA EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO (FRENTE 1), UBICADO EN EL CRUCE DE LAURA MENDEZ Y DIEGO MONTENEGRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	
CONTRATO:	DOP-CON-MUN-CCC-CSS-300-22		EN EL CRUCE DE LAURA MENDEZ Y DIEGO MONTENEGRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	
UBICACIÓN:				

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							TOTAL	
		ELEMENTO	DE	A	COCA	LARGO	JGO	PZA		UNIDAD
DOP-325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS PVC, 600V CT-SR, ANTIFLAMA, 90 °C, ROHS, CAL 10 AWG (13.3 MM ²) VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION									
			F	E	0.40	29.66		4.00	M	120.24
			F	E	0.40	0.69	7.00	4.00	M	30.52
			G	F	0.40	9.75		4.00	M	40.60
REPORTE FOTOGRAFICO										
										
		SUBTOTAL							M	191.36

HOJA 4

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.
 ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA

SUPERVISOR
 ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	CONTRATO No.	DOCUMENTO
	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22	E10
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE:	FECHA DE INICIO:
		FECHA DE TERMINO:
		FECHA DE APERTURA:
		27/04/2022
		26/02/2023
		31/03/2022

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida: E Análisis No.: 100
Análisis: DOP-042 PZA 1.0000
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHABANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2.,

MANO DE OBRA

Código	Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo Hora	Rendimiento	Costo
C: 1IP + 2 AYE	CUADRILLA: 1 INGENIERO EN PROGRAMACION + 2 AYUDANTES ESPECIALIZADOS					
MO-050	INGENIERO EN PROGRAMACION	1.000000	\$1,296.50	\$1,296.50	1.000000	\$1296.50
MO-022	AYUDANTE ESPECIALIZADO	2.000000	\$430.18	\$430.18	0.500000	\$860.36
	Importe:					\$2156.86
	Volumen:		\$6.00	\$6.00		\$12941.16
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$12941.16

EQUIPO Y HERRAMIENTA

Código	Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo Hora	Rendimiento	Costo
MQ-DELL-7060	DELL OPTIPLEX 7060 MICRO INTEL CORE i7, 8B, DDR4 SDRAM, 256 GB, WINDOWS 10 PRO.	48.000000	\$23.43	\$23.43	0.020833	\$1124.64
MQ-MNT-23	MONITOR LED DE 23"250CD/M, 1920X1080 PIXELES, 4MS CURVO, MARCA SAMSUNG	48.000000	\$13.25	\$13.25	0.020833	\$636.00
%MO-002	HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	0.030000	\$12,941.16	\$12,941.16	0.030000	\$388.23
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$2148.87
	(CD) Costo directo					\$15,090.03
	(CI) INDIRECTOS				9.84008%	\$1,484.87
	SUBTOTAL1					\$16,574.90
	(CF) FINANCIAMIENTO				0.10653%	\$17.66
	SUBTOTAL2					\$16,592.56
	(CU) UTILIDAD				8.24972%	\$1,368.89
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$17,961.45
	(* DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)					

CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2019
OBRAS Y EQUIPAMIENTO

No. CONS	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	NR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACIÓN DEL EXPEDIENTE O INFORMACIÓN
300	28/03/2019	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SOLICITAN TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD A LAS OBRAS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO DE REHABILITACION, REMODELACION Y CONTRUCCION EN LA BASE DE BOMBEROS BASE 4 EN CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO.	1934	452	ERNESTO HERNANDEZ	ATENDIDO EN OBRA	BAJA	ARCHIVO
301	28/03/2019	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC	EN RELACION A OFICIO QUE SE MANDO A EMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO DE OBSERVACIONES ACSOP/106/2019 HACEN CONTESTACION DE DA/193/2019	1937	453	MARCO POLO	CONOCIMIENTO Y ARCHIVO	BAJA	ARCHIVO
302	27/03/2019	MERCADOS SERVICIOS MUNICIPALES	CONSIDERAR EL RIESGO PARA PREVENCIÓN DEL PRÓXIMO TEMPORAL DE LLUVIAS. IMPERMEABILIZAR Y REPARACIÓN DE COLUMNAS CENTRALES.	1972	423	-	SE TURNA A PROYECTOS POR SER DE SU COMPETENCIA	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
303	25/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 051-18 EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS	1780	411	ERNESTO MEDINA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
304	25/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 081-14 XOLOT	1775	406	MOISES MONTES	SE MANDO OFICIO EQP/140/19 A EMPRESA PARA SU CONOCIMIENTO YA QUE POR VIA TELEFONICA NO SE PUDO LOCALIZAR	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
305	25/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 199-17 CONSTRUCTORA MONTE	1773	404	CARLOS DE LA MORA	SE LE ENTREGARON OBSERVACIONES A CONTRATISTA	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
306	25/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 178-18 PUREGUA	1772	403	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
307	22/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 079-18 CONSTRUCTORA 5392	1758	397	CARLOS DE LA MORA	se entregaron observaciones al contratista (Ramiro Villaseñor)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
308	22/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 177-17 IVEX	1755	394	CARLOS CASTELLANOS	se entregaron observaciones al contratista (Sergio Mercado)	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
GENERADOR



CONTRATO:	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22	Nº ESTIMACIÓN:	6-FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	07 DE OCTUBRE DE 2022		
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALISTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION		
Nº	CONCEPTO	UNIDAD
DOP-042	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2.	PZA

	CANTIDAD	UNIDAD						
MANDO	1.00	PZA						

TOTAL DE VOLUMEN EJECUTADO:		100000
------------------------------------	--	--------

INC. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE DE OBRA

CONTABILIDAD DE GASTOS Y EQUIPAMIENTO

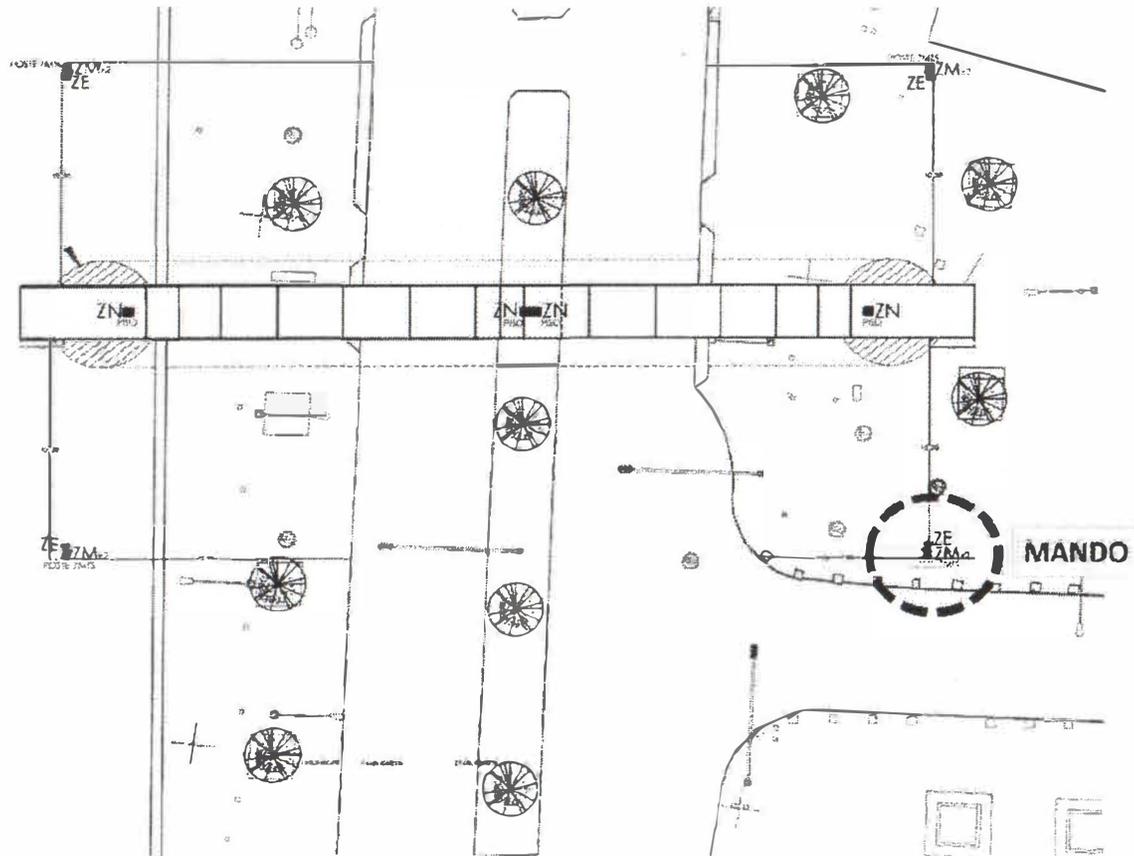
Nº CONS	FECHA	SOLICITANTE	ASUNTO	CC	Nº	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ESTATUS	UBICACION DEL EXPEDIENTE O INFORMACION
235	16/05/2019	DIRECCION RESILIENCIA	DAÑOS EN EL MERCADO LIBERTAD (SAN JUAN DE DIOS)	2564	727	EDUARDO DE LA PEÑA Y ELIAS SILVA	ATENDIDO EN OBRA	BAJA	ARCHIVO
237	16/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 183-18 DECOGSA	2661	719	VICTOR LEGORRETA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
238	14/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALOR DOCUMENTALES 205-16 TECNOLÓGOS E INGENIEROS	2819	683	CARLOS DE LA MORA	CONTESTADO	EQP/092/19	ARCHIVO
239	13/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 029-19 LOGISTICA CONSTRUCTIVA	2743	668	VICTOR LEGORRETA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
240	13/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 099-18 NMR	2742	657	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
241	13/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 153-18 NEG	2741	656	MAGDALENO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
242	13/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 057-17 KARSDS	2740	655	FERNANDO GARCIA	SE LE MANDO OFICIO EQP/67/19 POR QUE NO HAY RESPUESTA DE SU PARTE	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
243	13/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 078-18 DESAROLLADORA ABRÁ	2739	654	SERGIO NAVARRO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
244	09/05/2019	JEFATURA DE CENTRO COMUNITARIO	SOLICITAN INSPECCION CENTRO COMUNITARIO DE LOMAS DEL PARANISO JOAQUIN MUCELL 646	2736	675	MARCO POLO	CONTESTADO	EQP/163/19	ARCHIVO
245	09/05/2019	CONTINGENCIAS	MERCADO SAN JUAN DIOS SE SOLICITA SU DEBIDA REPARACION EN TODA LA CELOSIA		1438	EDUARDO DE LA PEÑA Y ELIAS SILVA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
246	07/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 023-18 LOGISTICA CONSTRUCTIVA		632	CARLOS DE LA MORA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
247	07/05/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 005-18 INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL		631	VICTOR LEGORRETA	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO
248	07/03/2019	CONTRALORIA CIUDADANA	OBSERVACIONES CONTRALORIA DOCUMENTALES 103-19 CONCRETE		623	LUIS GUERRERO	ATENDIDO	SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA Y AUDITORIA	ARCHIVO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
GENERADOR



CONTRATO:	DOP-RES-MUN-CUL-LP-143-22	N° ESTIMACIÓN:	6-FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	07 DE OCTUBRE DE 2022		
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO Y PIEZA ICÓNICA SOBRE LA MEMORIA DEL PUENTE PEATONAL DE LA NORMAL, UBICACIÓN EN AV. ALCALDE Y AV. NORMALUSTAS EN LA COL. MIRAFLORES DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADAJARA, JALISCO.				
CLAVE:	DOP-042 PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHABANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c-200 KG/CM2.				

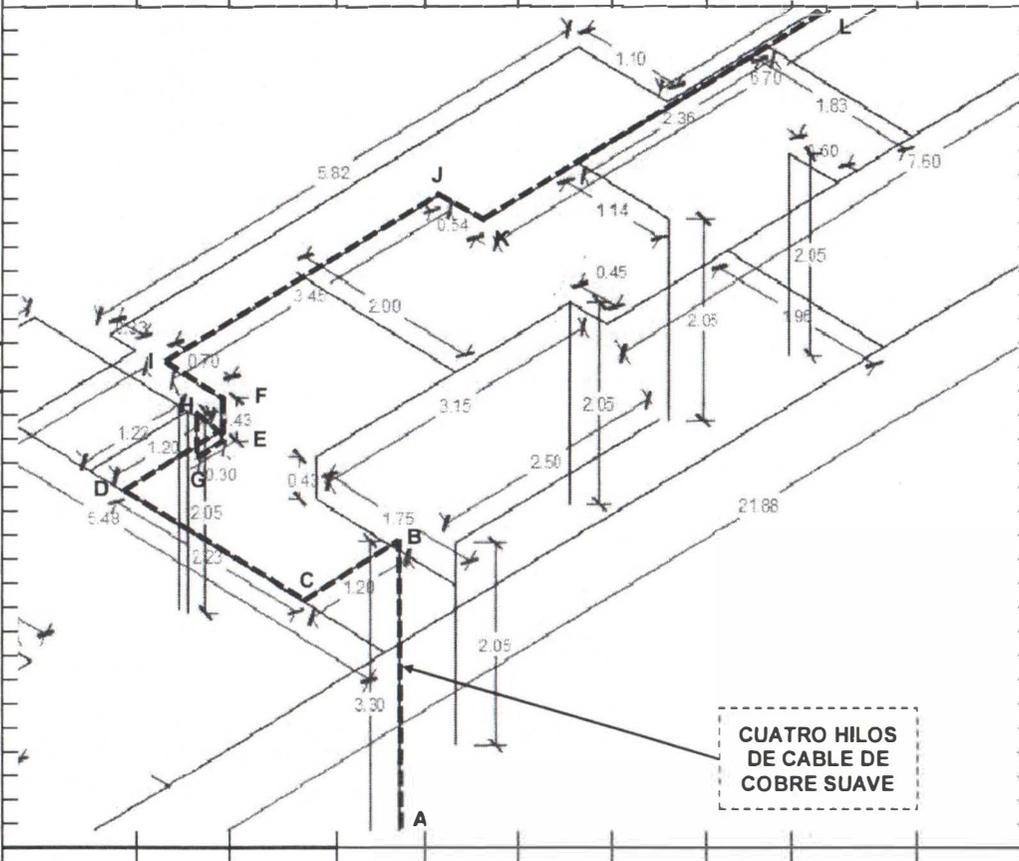


INC. VICTOR MANUEL LECORRETA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.
RESPONSABLE DE OBRA

GENERADORES DE OBRA

ESTIMACION:	06 (SEIS)	CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.	 <p style="font-size: small;">Gobierno de Guadalajara</p>
PERIODO:	DEL 19 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COLMENA EN LA COL. BALCONES DEL CUATRO (FRENTE 1), UBICADO EN EL CRUCE DE LAURA MENDEZ Y DIEGO MONTENEGRO EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	
CONTRATO:	DOP-CON-MUN-CCC-CSS-300-22			
UBICACIÓN:	EN EL CRUCE DE LAURA MENDEZ Y DIEGO MONTENEGRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.			

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION							TOTAL
		ELEMENTO			ALTO	LARGO	ANCHO	PZA	
DOP-325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS PVC, 600V CT-SR, ANTIFLAMA, 90 °C, ROHS, CAL 10 AWG (13.3 MM²) VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
REPORTE FOTOGRAFICO									
									

HOJA 2

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V.
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ DAVILA

SUPERVISOR
ING. LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ
