


Gestión Integral
de la Ciudad

565-220/2018



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte el **Municipio de Guadalajara, Jalisco**, representado por los ciudadanos JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA y ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal y Síndica, todos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará **"EL MUNICIPIO"** y por otra parte la sociedad mercantil denominada **Planeación Urbana S.A. de C.V.**, representada por el C.P. Gabriel Hernández Ruíz en su calidad de Poder general judicial o extrajudicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"** ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO", declara:


I.1.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73, 79, fracción X 80 fracción III, 85 fracción I, IV, 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 10, 37 fracción V y XII, 38 fracción II, 41, 47 fracción VII, 52 fracciones II, 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3, 6, 41, 42 fracción IV, 51 fracción XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, Jalisco, artículo 1, 3, 8, 9 fracciones I y III, 10 fracciones I y III, 10 fracciones I y IV, 42 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Guadalajara.


I.2.- Que con fundamento legal en los artículos 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1 fracción I, 50 Puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1 fracción I, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, en la modalidad de Adjudicación Directa de la obra denominada TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLÁN, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO., a la cual se le asigna el número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, financiado a través de RECURSO MUNICIPAL.

I.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL MUNICIPIO", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que "EL CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa

ARS


Página 1 de 26

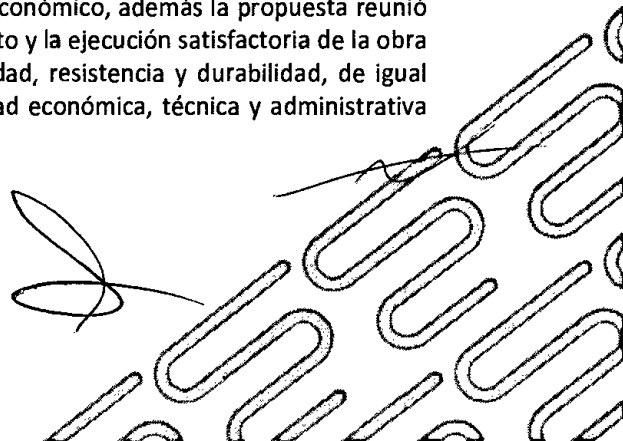

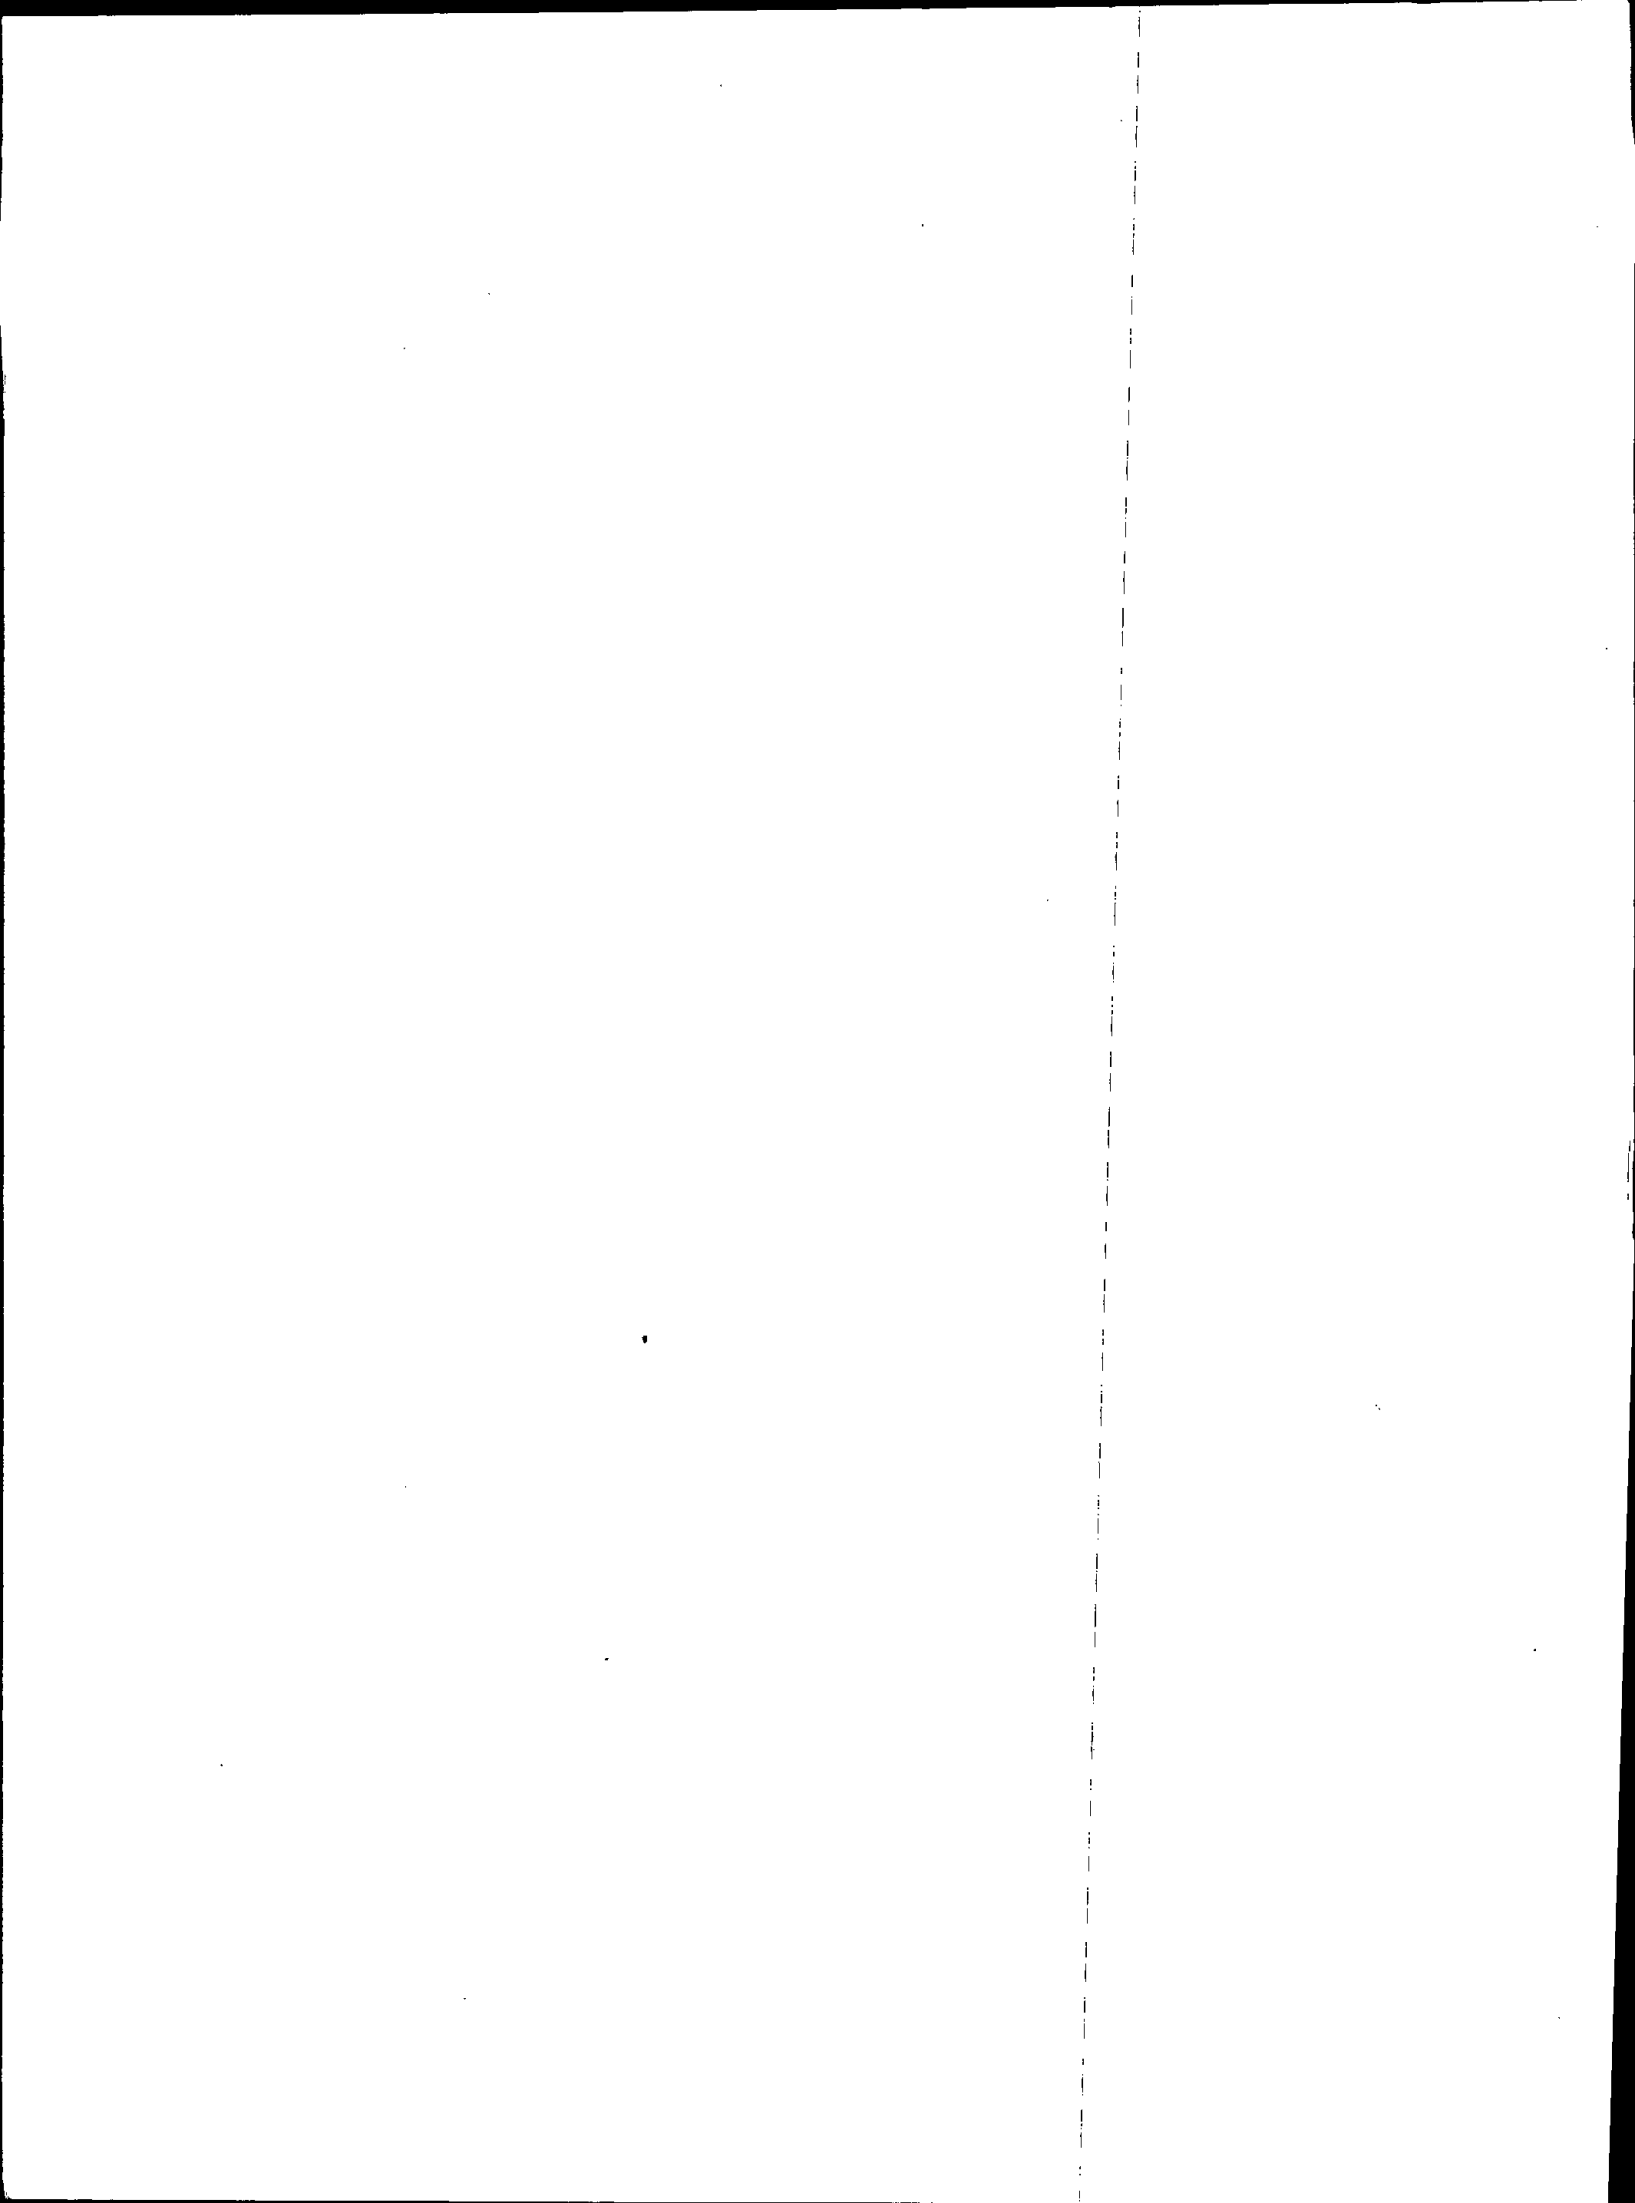



Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

congruente con los trabajos a realizar, así como a que fue de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y autorizó la liberación del recurso municipal mediante sesión ordinaria 01/18 de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública celebrada el día 12 de Enero de 2018.

I.5.- Con registro federal de contribuyentes es: **MGU-420214-FG4**, tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 400 (cuatrocientos) de la Avenida Hidalgo, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación en modalidad de Adjudicación Directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 81, 82 punto 1 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, se comunicó a "EL CONTRATISTA" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, y en escrito de fecha 19 de enero de 2018, "EL CONTRATISTA" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "EL MUNICIPIO" hizo saber su resolución a "EL CONTRATISTA", el día 1 de febrero de 2018, en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo, con fundamento en lo aprobado por la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, en la sesión extraordinaria 02/18 con fecha 31 de Enero de 2018.


1.7.-Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.


II.- "EL CONTRATISTA" declara:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, denominada **Planeación Urbana S.A. de C.V.**, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 12373 de fecha 25 de julio de 1974, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Luviano Jaramillo, Notario Público número 65 del Municipio de Guadalajara, Jalisco; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la

ARS

Página 2 de 26

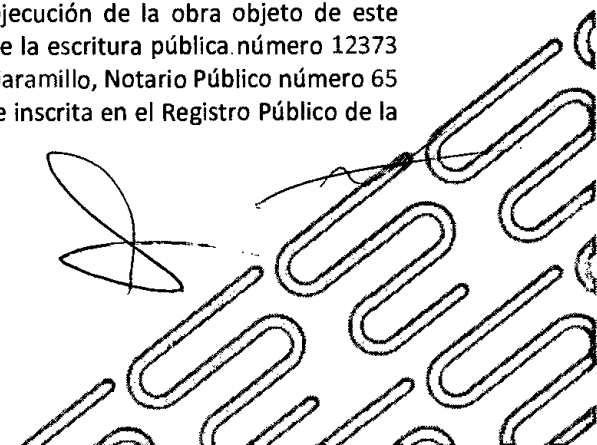





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

Propiedad y del Comercio Bajo Inscripción 2 en el Libro 102 de la Sección Tercera, y se matriculó bajo el número 132 en el Libro 40 de la Sección Primera del Registro de Comercio a Cargo de la Primera Oficina, Habiéndose archivado una copia del testimonio registrado, bajo el número 2 al Libro 5850 de Documentos Generales con fecha 02 de Septiembre de 1982.

II.2.-El C.P. Gabriel Hernández Ruíz, quién se identifica con credencial para votar **9. Eliminado** acredita su carácter de Poder general judicial o extrajudicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con el testimonio de la Escritura Pública 57197 de fecha 28 de abril de 1989, otorgada ante la fe del Lic. Enrique M. Camarena Font-Reaulx, Notario Público número 17 del Municipio de Guadalajara, Jalisco, Registrado bajo Inscripción 202 del Tomo 307 del Libro Primero del Registro de Comercio. Agrego con número 30 al Apéndice 977 de este Libro la Documentación respectiva, con fecha 17 de Mayo de 1989., mandato que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado.


II.3.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en calle **6. Eliminado** **6. Eliminado** aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyentes número PUR740725SA6. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con la clave GDL-1582/05.


II.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, así como, el contenido de los anexos 1 y 2 que contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el representante legal; 2).- Catálogo de conceptos; mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también el 100% (cien por ciento) de análisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", formarán parte integrante de este contrato.





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

II.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 86 numeral 2 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

II.9.- Que por la sola comparecencia y firma de este documento, asientan tener las facultades y capacidad jurídicas necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo y estar dentro de los márgenes legales que señalan los diversos ordenamientos que los rigen, artículos 1267 al 1270 del Código Civil del Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 44 y 50 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

III.- "AMBAS PARTES" declaran:

III.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.


III.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar la obra consistente en: "TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLÁN, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.", para ejecutarse en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al **1).**- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; **2).**- Catálogo de conceptos: documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

ARS





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de \$ 386,307.05 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.), más \$ 61,809.13 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N.) de I.V.A., para un importe total de \$ 448,116.18 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 18/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes, por lo que si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 45 días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 7 de febrero de 2018, y a concluirla el día 23 de marzo de 2018, conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato.


CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "EL MUNICIPIO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.


Asimismo, "EL MUNICIPIO" se ve obligado a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su realización, *cuya tramitación sea competencia* de "EL MUNICIPIO", observando tanto "EL MUNICIPIO" como "EL CONTRATISTA" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.


El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "EL MUNICIPIO" otorgará por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de \$ 134,434.85 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS


ARS

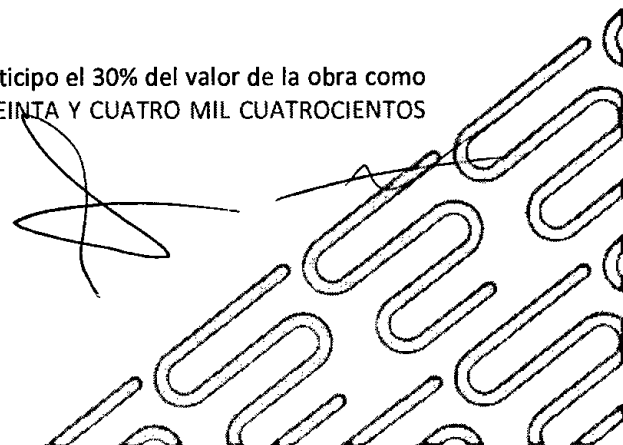





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.) Incluye I.V.A., para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "EL CONTRATISTA" será motivo de diferimiento, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.


Plazo para presentar documentación de anticipo. "EL CONTRATISTA", tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "EL MUNICIPIO" no otorgará anticipo para estos trabajos.

SIXTA.- FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

ARS


Página 6 de 26







Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. "EL MUNICIPIO" debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EL MUNICIPIO", por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.


Conceptos No Previstos en el Catálogo. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

ARS


Página 7 de 26







Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

B).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D).- La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 20 (veinte) días naturales posteriores a la última fecha de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS:


Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 134,434.85 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, la debida y correcta aplicación, amortización o devolución total o parcial del anticipo otorgado por el Municipio en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1884140, con fecha de 6 de febrero de 2018, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.


Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.


Fianza otorgada a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco., por la cantidad de \$ 44,811.62 (CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, garantizando el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base

ARS

Página 8 de 26

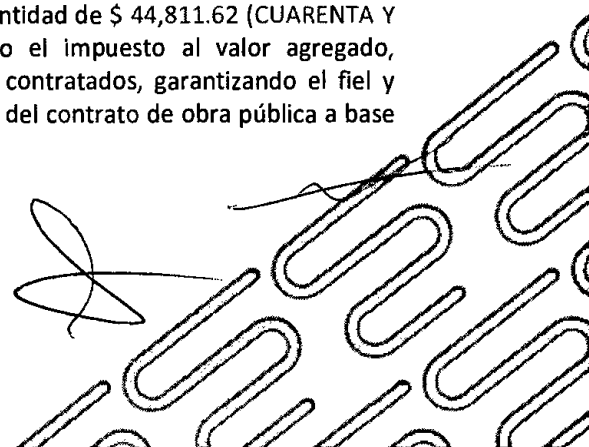





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

de precios unitarios, presentando la póliza de fianza No. 1884184, con fecha de 6 de febrero de 2018, otorgada por la afianzadora ACE FIANZAS MONTERREY S.A., a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:


- A).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO".
- C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
- D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.


En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA" derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá obtener la modificación de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. "EL MUNICIPIO" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA" la resolución de la rescisión administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Una vez finalizada la obra, para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del Municipio de Guadalajara, Jalisco, la cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.


"EL MUNICIPIO" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

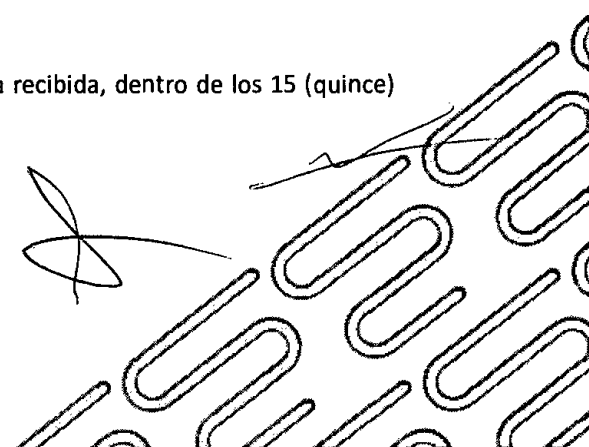





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

Si el informe es favorable, "EL MUNICIPIO" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "EL MUNICIPIO" procederá a dictar las instrucciones oportunas a "EL CONTRATISTA", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.


Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:


En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO"

ARS


Página 10 de 26

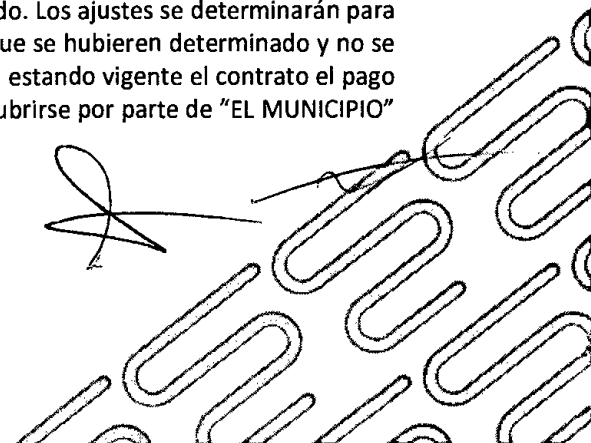





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

a solicitud de "EL CONTRATISTA", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.


"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.


NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, previamente aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón será el único responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "EL CONTRATISTA", se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO", bajo ninguna circunstancia se considerará patrón sustituto, intermediario o responsable solidario, por ser ajeno a ese vínculo obrero patronal, y no existir subordinación de los auxiliares de "EL CONTRATISTA", quedando a salvo de cualquier reclamación o indemnización que se origine entre aquellos, siendo por ende "EL CONTRATISTA", el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, trabajadores, factores o dependientes, liberando a "EL MUNICIPIO", y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamación o responsabilidad. Artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.


ARS

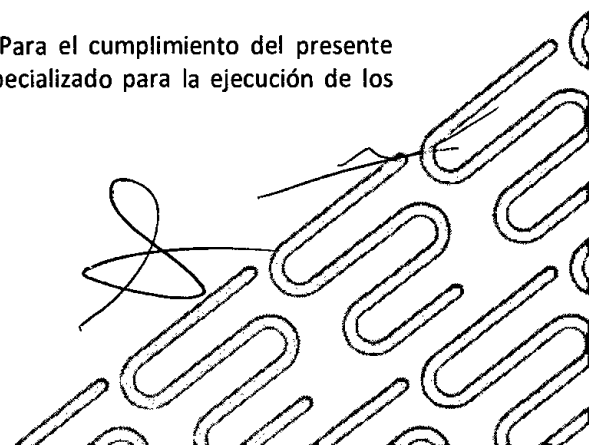





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- Daños a Terceros. - "EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" y en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera, subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "EL MUNICIPIO" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.


Calidad de los Materiales.- Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".


Proveedores y Prestadores de Servicios.- "EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

Es obligación de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" mismos que se describen en el


ARS

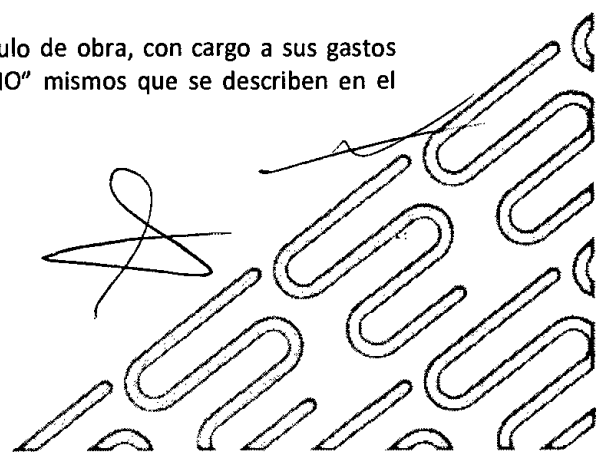





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

anexo, en caso de incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, "EL MUNICIPIO" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "EL CONTRATISTA" no atiende los requerimientos en un plazo de 10 (diez) días hábiles, "EL MUNICIPIO" , podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, "EL MUNICIPIO" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN.- "EL MUNICIPIO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", en el cual se registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.


El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios convencionales.


DÉCIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas

ARS


Página 13 de 26

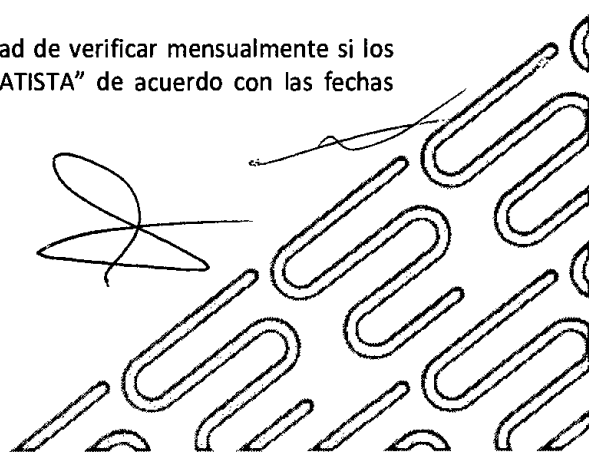





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

previamente pactadas, para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará mes a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05x(ic-ie)$.

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: $=0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30$

IC= Inversión contratada

IE= Inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.


Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

ARS


Página 14 de 26







Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.


"EL MUNICIPIO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".


Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNICIPIO", sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "EL CONTRATISTA" quién estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndose al monto, la comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la


ARS

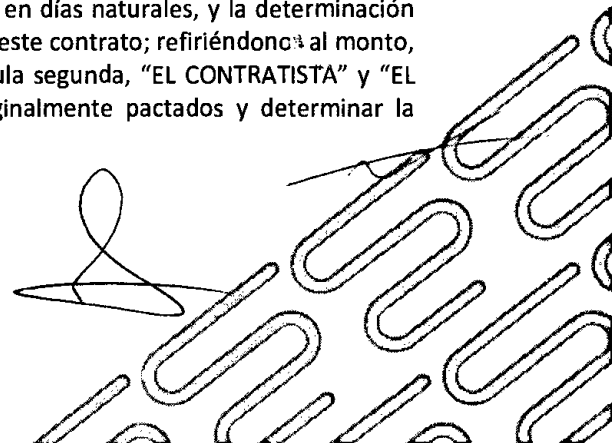





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos, parte de este contrato y obligatorias para "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" podrá suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para "EL MUNICIPIO", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con 5 (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.


Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspensión.

ARS


Página 16 de 26







Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATISTA" o "EL MUNICIPIO" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de inicio y terminación.


DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales competentes.


En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.



DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNICIPIO", sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
- 2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".
- 3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL MUNICIPIO".
- 4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "EL MUNICIPIO".
- 5.- Si "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

ARS

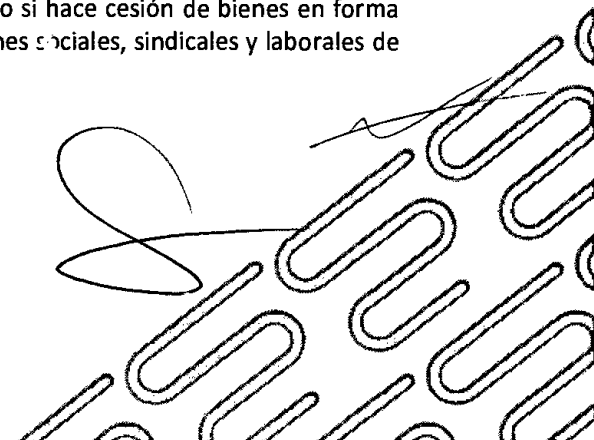





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

7.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.


10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.


Pago por Rescisión.- Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el monto de la garantía otorgada.



VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.-Acuerdan "LAS PARTES", que el "MUNICIPIO", podrá rescindir el contrato de obra sin necesidad de declaración judicial, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 53 puntos 2 y 3 y 54 fracción "IV" del punto "1" del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco bajo el siguiente procedimiento:

I.- Se iniciará a partir de que a "EL CONTRATISTA", le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido para que en un término de **diez días hábiles** exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, haciéndosele saber la fecha, la hora y el lugar (domicilio de la obra) en que tendrá verificativo el levantamiento de acta circunstanciada de comprobación, medición, recepción y liquidación de los trabajos realizados, misma que se llevara a cabo ante Fedatario Público, Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara y la Dirección del Área de Construcción y Supervisión de Obra Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco; de conformidad al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

II.- El día y hora fijado para el levantamiento del acta circunstanciada se llevará a cabo en el lugar donde se realicen los trabajos, recibiendo los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA" en el estado en que estos se

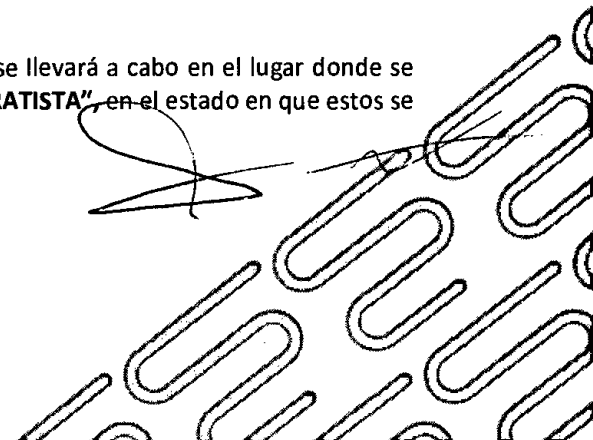





**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

encuentren, debiéndose detallar en dicha acta el estado físico en que se encuentre la obra, de conformidad con el calendario de obra que esté aprobado por la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, la inasistencia de "EL CONTRATISTA", habiendo sido notificado legalmente no invalida el acto.

III.- Transcurrido el termino probatorio a que se refiere el punto "I", uno de la presente clausula, se dictara determinación fundada y motivada de dar o no, por rescindido el contrato, considerando los argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer, de conformidad a lo dispuesto por el numeral al punto "2" de la fracción "IV" del numeral 54 del Reglamento de Obra Pública para el municipio de Guadalajara, Jalisco, esta determinación se notificara a "EL CONTRATISTA", en forma personal, para que en el término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga o interponga los juicios o recursos que estime pertinentes.


IV.- A partir de que se levante el acta circunstanciada de comprobación, medición y liquidación mencionada en el punto "I", de la presente clausula "EL MUNICIPIO", tomara inmediatamente la posesión legal y material de la obra.


V.- Desde la fecha en que se tome posesión legal y material de la obra "EL MUNICIPIO", quedará liberado de cualquier obligación contractual que lo una con "EL CONTRATISTA", a excepción de las obligaciones de pago de las estimaciones que se encuentren en trámite y el finiquito correspondiente de conformidad a la fracción "IV" del numeral 54 Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

VI.- A partir de la fecha en que "EL MUNICIPIO", tenga la posesión legal y material de la obra, tendrá las más amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada a través de otra empresa o ejecutar los mismos, por Administración directa, en virtud de la Rescisión Administrativa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.


ARS

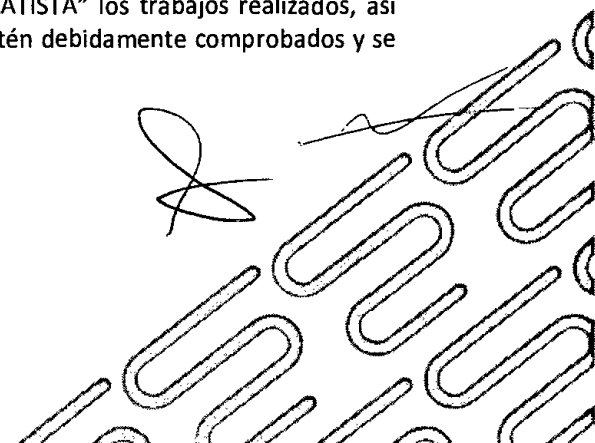





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

En cualquier caso, de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora, debiendo "EL MUNICIPIO" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos indicados por el Reglamento de Obra Pública de Municipio de Guadalajara.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a regresar a "EL MUNICIPIO" en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme al Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:


A).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO", en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.


B).- Cuando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C).- Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.


ARS

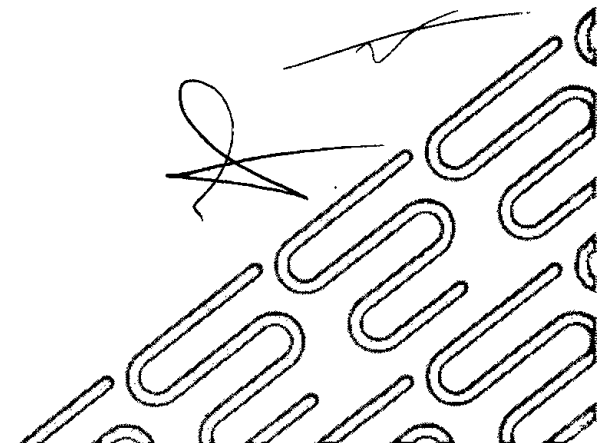





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo en que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO". Cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se elaborará el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.


"EL MUNICIPIO" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA" mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.


El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.


El finiquito deberá ser elaborado por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración: en el término señalado en el párrafo anterior, "EL MUNICIPIO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un término de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a


ARS

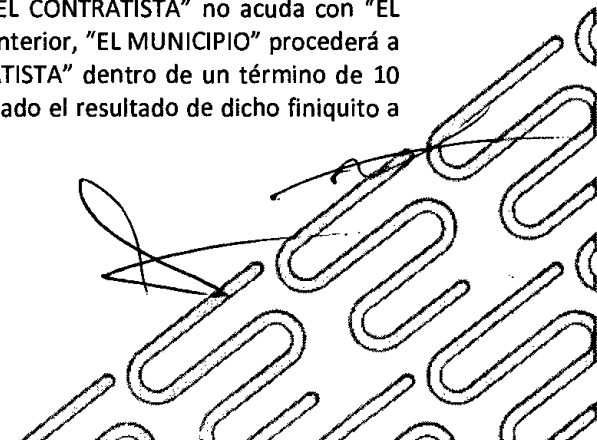





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

"EL CONTRATISTA" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO" el importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", en caso de no obtener reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, la que deberá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueran suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".


Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" leba hacer a "EL CONTRATISTA".

ARS





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PARTES”, acuerdan que la Tesorería Municipal llevará a cabo el finiquito de los trabajos contratados, siempre y cuando le sea proporcionado por la dependencia encargada de ejecutar la obra, el informe final de auditoría que con motivo de la revisión de los mismos realiza la Contraloría Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los numerales 63 y 138 fracción “IV” del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO” dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado

C).- El titular de la Dirección General Jurídica Municipal de “EL MUNICIPIO”, al emitir la resolución citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.


D).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la bitácora.

VIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIOS.- “EL CONTRATISTA”, señala como domicilio legal para recibir notificaciones el que señale en el punto II.4 del apartado de declaraciones de conformidad a los artículos 82, 84, 85, 86 y 87 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento del Acto y Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como a los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria; quien, de modificarlo sin previo aviso a “EL MUNICIPIO”, con por lo menos 05 cinco días hábiles de anticipación, se entenderá al antes mencionado como el domicilio legal.

ARS


Página 23 de 26







Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

En caso de que "EL CONTRATISTA", cambie de domicilio sin existir la notificación anteriormente mencionada y se actualice el caso de que "EL MUNICIPIO", deba, llevar a cabo algún tipo de notificación a "EL CONTRATISTA", y el domicilio se encuentre cerrado, bastará que se haga constar en el acta respectiva por el funcionario encargado de llevarla a cabo misma que se practicara en los términos del numeral 108 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mediante lista de acuerdos que se publicara en lugar visible en los estrados de este Ayuntamiento y la notificación surtirá todos los efectos legales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 6 de febrero de 2018.


POR "EL MUNICIPIO"

JUAN ENRIQUE BARRA PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA
SINDICA MUNICIPAL




Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**



Gobierno de
Guadalajara

**JORGE GASTÓN GONZÁLEZ-ALCÉRRECA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON CARÁCTER DE TESTIGO
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad**

Irlanda Baumbach

**IRLANDA LORERYTHE BAUMBACH VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL
TESTIGO**

"EL CONTRATISTA"


12. Eliminado


C.P. Gabriel Hernandez Ruiz
C.P. Gabriel Hernandez Ruiz

**Poder general judicial o extrajudicial para pleitos y cobranzas y para actos de administración
De la sociedad mercantil denominada Planeación Urbana S.A. de C.V.**

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD


Se hace de su conocimiento que la información recabada en el presente documento y anexos es confidencial y que la sociedad mercantil denominada Planeación Urbana S.A. de C.V., se compromete a protegerla de conformidad con lo establecido en el artículo 6 apartado A, fracciones II y III así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 20,21,22,23 numeral 1 fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2° fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida y los artículos Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial y Reservada emitidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

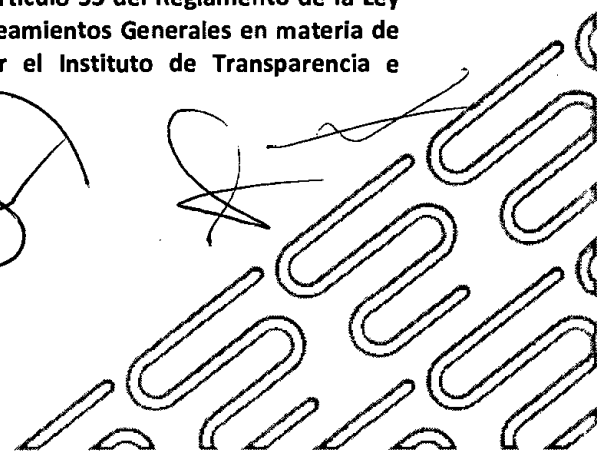





Gestión Integral
de la Ciudad





Gobierno de
Guadalajara

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DENOMINADO DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, CELEBRADO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Planeación Urbana S.A. de C.V. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE TRABAJO NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18 ADJUDICADA BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN SESION 02/18 DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA; CONSISTENTE EN 26 VEINTISEIS FOJAS POR UN SOLO LADO INCLUYENDO ESTA.


ARS

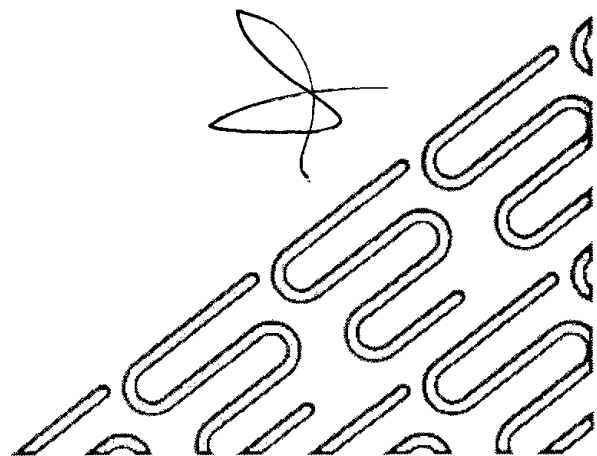





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 1

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SINDICA MUNICIPAL

ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

EL CONTRATISTA

12. Eliminado

Planeación Urbana S.A. de C.V.


TESTIGOS

TESORERA

Irlanda Baumbach
IRLANDA LORERYTHE BAUMBACH VALENCIA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA




Gobierno de

Guadalajara

Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Planeación Urbana S.A. de C.V. El día 6 de febrero de 2018, respecto de la obra: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLÁN, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

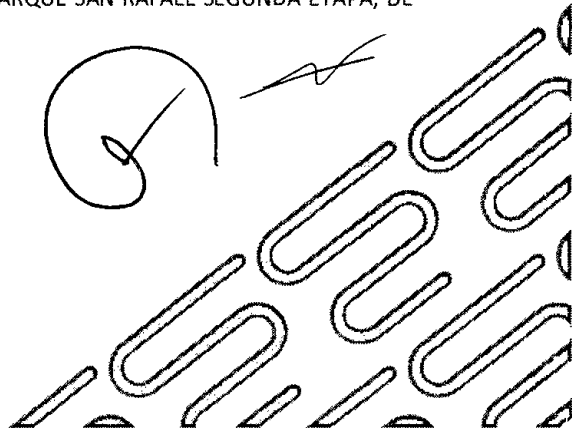



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
01.01.00	TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.		1.00	07/02/2018	45.00	23/03/2018			
DOP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA REDONDO CHICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, CESPOL No. 207, EMPAQUE CHUPON DE NEOPRENO DE 2 1/4", EXTENSIÓN PARA LAVABO CROMADO DE 20 CM., SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	07/02/2018	3.00	09/02/2018	\$15,989.12		\$15,989.12

12. Eliminado

\$15,989.12
\$15,989.12

\$0.00
\$0.00

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES,
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.


Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DDP-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 610 MM. SATINADA, INCLUYE: CARGA Y ACRREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	4.00	07/02/2018	3.00	09/02/2018	□ \$3,628.04		\$3,628.04
DOP-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 700 MM. SATINADA, INCLUYE: CARGA Y ACRREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	07/02/2018	3.00	09/02/2018	□ \$7,422.96		\$7,422.96

12. Eliminado

\$11,051.00 \$0.00
\$27,040.12 \$0.00

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO PARA WC DE PEDAL APARENTE ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 Ó 38 MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. 4.80 LITROS POR DESCARGA PRESIÓN REQUERIDA 1 KG/CM2., INCLUYE: MATEIRALES CONSUMIBLES, NIPLE GALV. 1" X 15CM., NIPLE GALV. 1" X 20CM., COPLE GALV. 1", REDUCCIÓN 1 1/4"-1", TUBO DE BRONCE CROMADO DE 1 1/4" PARA FLUXOMETRO, CHAPETON GDE PARA SPUD 38 MM., CR RF-278, CHAPETON 42 MM. PARA FLUXOMETRO DE PEDAL RF 813, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	7.00	07/02/2018	3.00	09/02/2018	□ \$36,102.99		\$36,102.99

12. Eliminado

\$36,102.99
\$63,143.11

\$0.00
\$0.00

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-05	ALIMENTACIÓN HIDRAULICA PARA RECUPERACIÓN DE AGUA HACIA VASO DE LA ALBERCA CON TUBERIA DE CPVC 3/4" CON UN DESARROLLO DE 6.60 MTS., INCLUYE: DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A LUGAR DE ACOPIO, CONEXIÓN DESDE LA TOMA DOMICILIARIA EN CISTERNA HACIA CUARTO DEL HIDRONEUMATICO CON 2 CODOS CPVC 3/4"x90°, 6.60 ML TUBERIA DE 3/4" DE CPVC, 1 TEE CPVC 3/4", 1 TAPON CPVC HEMBRA, 2 CONECTORES HEMBRA 3/4" CPVC, CUADRO GALVANIZADO PARA CONTROL DEL CIERRE Y APERTURA DEL AGUA POTABLE CON MATERIAL GALVANIZADO QUE CONSTA DE 1 TEE GALV. 3/4", 4 CODOS GALV. DE 3/4"x90°, 2 NIPLES GALV. 3/4"x12", 2 NIPLES GALV. 3/4"x6", 1 VALVULA ESFERA 3/4" , MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	12/02/2018	5.00	16/02/2018	<input type="checkbox"/> \$2,800.21		\$2,800.21

12. Eliminado

\$2,800.21
\$66,943.32

\$0.00
\$0.00

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-06	INSTALACIÓN DE CERCACEL EXISTENTE PARA PROTECCIÓN Y RESGUARDO DE CALENTADORES SOLARES EN AZOTEA DE 9.35 X 3.95X 2.50 MTS., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 300 MTS., COLOCACIÓN DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" EN CADA POSTE (13 PZAS) , ELABORACIÓN DE PUERTA DE 0.85 X 2.30 MTS, CON PASADOR Y PORTA CANDADO, CANDADO PHILLIPS CON LLAVES, 15 ABRAZADERAS PARA CERCACEL, PINTURA ESMALTE BLANCO SOBRE CERCALCEL VERDE A DOS MANO Y DOS CARAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (66.40 M2)	PZA	1.00	13/02/2018	4.00	16/02/2018	<input type="checkbox"/> \$9,559.13		\$9,559.13

12. Eliminado

\$9,559.13
\$76,502.45

\$0.00
\$0.00

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN EXTERIOR PARA BODEGA DE 2.50 X 2.40 MTS. A DOS HOJAS ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRAMARCO, REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL. 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, GUARDAPOLVO, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALRES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$14,373.83	\$14,762.32	\$29,136.15

12. Eliminado

\$14,373.83
\$89,876.28

\$14,762.32
\$14,762.32

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-08	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EXTERIOR DE 1.16 X 2.40MTS CON SOLERA 1 1/2" x 3/16" Y PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" ZETA PERSIANA CAL. 18 T CUADRADO DE 1/2" COMO REFUERZO EN "Z", INCLUYE CHAPA PHILLIPS725, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA DE LAS UNIONES DE LAS Z PERSIANAS, , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, GUARDAPOLVO, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$7,324.64	\$7,522.60	\$14,847.24

12. Eliminado

\$7,324.64
\$97,200.92

\$7,522.60
\$22,284.92

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-09	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS PARA VERTEDERO NIÑAS DE 1.15 X 2.80 MTS. CON FIJO SUPERIOR. ABATIBLE CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRA-MARCO, REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL. 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$3,380.19	\$3,661.87	\$7,042.06

12. Eliminado

\$3,380.19
\$100,681.11

\$3,661.87
\$26,946.79

IZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS PARA VERTEDERO NIÑOS DE 1.43 X 2.80 MTS. CON FIJO SUPERIOR. ABATIBLE CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRA-MARCO, REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL. 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$3,507.73	\$3,800.05	\$7,307.78

Suma en la hoja:

\$3,607.73 \$3,800.05
\$104,088.84 \$29,746.84

12. Eliminado

DEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TUBULAR DE 0.35X0.35X0.35 (04 PZAS) ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES A BASE DE TUBULAR DE 1"X1" CAL.18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, 4 PATAS DE 0.35 MTS. CON TUBULAR DE 1"X1" CON SOLERA DE 2" X 10 CM., 8 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4"X 1 1/2" X 1 PZAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$1,030.66	\$1,116.54	\$2,147.20

12. Eliminado

\$1,030.66
\$106,119.60

\$1,116.54
\$30,863.38

Z RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE 2.47 X 0.47 MTS CON PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" EN MARCO Y CONTRAMARCO CON ZETA PERSIANA CAL. 18 CON PORTA CANDADOS, INCLUYE: DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA DE LAS UNIONES DE LAS Z PERSIANAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$2,502.33	\$2,502.33	\$5,004.66

Suma en la hoja:

\$2,502.33


\$2,502.33

12. Eliminado

\$107,621.83

\$33,366.71

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE 2.10 X 0.56 MTS CON PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" EN MARCO Y CONTRAMARCO CON ZETA PERSIANA CAL. 18 CON PORTA CANDADOS, INCLUYE: DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA DE LAS UNIONES DE LAS Z PERSIANAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2.00	23/02/2018	12.00	06/03/2018	\$2,652.03	\$2,652.03	\$5,304.06

Suma en la hoja:

\$2,652.03
\$110,273.86

\$2,652.03
\$36,017.74

12. Eliminado

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES,
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-14	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA CASETA DE HIDRONEUMÁTICO DE 1.42X3.35 A BASE DE PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRA-MARCO, TRASLAPE DE SOLERA DE 1 1/2", REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN EN PISO Y BOVEDA, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 72S Y CANDADO, PICAPORTE PARA PISO Y BOVEDA, REPIZA DE LAMINA CAL. 18 A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", PUERTA SUPERIOR PARA REPIZA A BASE DE PTR 1 1/2" EN MARCO Y CONTRA-MARCO, ZETA PERSIANA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	23/02/2018	10.00	04/03/2018	\$6,496.97	\$3,654.55	\$10,151.52

12. Eliminado

\$6,496.97
\$116,770.83

\$3,654.55
\$39,672.29

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-15	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA CASETA DE BOMBAS DE CALOR DE 5.15 X 3.60 MTS. A UNA ALTURA DE 2.50 MTS. ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES A BASE ANGULO 1" X 1" X 3/16", REFUERZO DE PTR 2" X 2" CAL. 14 EN EL PERÍMETRO DE LA REJA Y AL CENTRO DE LA MISMA, PARRILLA DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PLACAS DE 5X12 CM. X 1/2" PARA SOPORTE DE LA REJA SOBRE POSTES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, GRUA MANUAL PARA SU COLOCACIÓN, FONDO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PINTURA VERDE A DOS MANOS Y DOS CARAS, SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	23/02/2018	10.00	04/03/2018	\$11,810.80	\$6,643.58	\$18,454.38

12. Eliminado

\$11,810.80
\$128,681.63

\$6,643.58
\$46,316.87

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-16	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOTILLA INGRESO HOMBRE PARA AZOTEA DE 0.70 X 1.40 MTS. ELABORADA A BASE DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL.14 EN MARCO Y HOJA CORREDIZA, GUÍAS DE ANGULO DE 2" X 1/4", LAMINA LISA CAL 18, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN HASTA LA AZOTEA, PORTA CANDADO DE SOLERA DE 2", 1 CANDADO PHILLIPS CON LLAVES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	22/02/2018	5.00	26/02/2018	\$2,200.51		\$2,200.51

12. Eliminado

\$2,200.51
\$130,782.14

\$0.00
\$46,315.87

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-17	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.45 X 1.65X 0.95 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" BLANCO CAL. 12, CON SEIS PATAS DE 0.95 MTS. CON PLACAS DE 10X10 CM. EN CADA UNA DE ELLAS DE PLACA DE 1/2", ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DE LOSA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO H.O. F'C= 150 KG/CM2, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TDDO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	22/02/2018	2.00	23/02/2018	0 \$5,713.30		\$5,713.30

12. Eliminado

\$5,713.30
\$136,495.44

\$0.00
\$46,315.87

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-1B	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.07 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	19/02/2018	8.00	26/02/2018	\$2,749.24		\$2,749.24


Suma en la hoja:

\$2,749.24
\$139,244.68

\$0.00
\$46,316.87

12. Eliminado

FEZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-19	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.28 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	19/02/2018	8.00	26/02/2018	\$2,206.88		\$2,206.88

12. Eliminado

\$2,206.88
\$141,451.56

\$0.00
\$46,316.87

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-20	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.20 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID VS 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	19/02/2018	8.00	26/02/2018	\$2,214.35		\$2,214.35

12. Eliminado

\$2,214.35
\$143,665.91

\$0.00
\$46,315.87

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN. DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-21	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 2.68 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2.00	19/02/2018	8.00	26/02/2018	\$4,416.08		\$4,416.08


12. Eliminado

\$4,416.08
\$148,081.99

\$0.00
\$46,315.87

EZ RUIZ
LEGAL





PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Ajudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA. JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	-------

FIJOS LATERALES SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA HERRERIA, DEMOLICIÓN MANUAL EN BOVEDA PARA ANCLAR EN VIGUERIA CON SOLDADURA CADA UNA DE LAS PATAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO, RECIBIR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:5 CADA UNA DE LAS PATAS EN LA BOVEDA, LIMPIEZA CON THINER PARA ELIMINACIÓN DE POLVOS Y GRASAS EN EL PTR, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRIS MARTILLO COMEX 712 A DOS MANOS, LOSA DE 10 CM. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 H.O. DE 3.72 X1.18 MTS., CIMBRA COMÚN, ARMADO CON VAR#3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENLADRILLADO CON LADRILLO ROJO DE AZOTEA DE 17X17 CM. VOLANDO 2 CM. DEL LADRILLO FUERA DE LA LOSA, LECHADEO CON CEMENTO-ARENA DE RIO SOBRE ENLADRILLADO, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

Suma en la hoja:

\$0.00


\$0.00

12. Eliminado

\$150,308.16

\$46,315.87

EZ RUIZ
D LEGAL



PU


APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.


Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-24	NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. ELABORACIÓN DE LINTERNILLA A BASE DE MARCO DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" DE 2.63 X 0.77 MTS. Y 6 PATAS DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" DE 1.05 MTS. FORMANDO 4 CLAROS PARA ALOJAR VENTANAS DE ALUMINIO ABATIBLES HACIA EL EXTERIOR Y DOS FIJOS LATERALES SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA HERRERIA, DEMOLICIÓN MANUAL EN BOVEDA PARA ANCLAR EN VIGUERIA CON SOLDADURA CADA UNA DE LAS PATAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPID, RECIBIR CON MDRTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:5 CADA UNA DE LAS PATAS EN LA BOVEDA, LIMPIEZA CON THINER PARA ELIMINACIÓN DE POLVOS Y GRASAS EN EL PTR, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRIS MARTILLO COMEX 712 A DOS MANOS, LOSA DE CONCRETO F' C= 150	pza	2.00	07/02/2018	10.00	16/02/2018	 \$12,101.30		\$12,101.30

Suma en la hoja: \$29,673.84 \$0.00
\$179,982.00 \$46,316.87

12. Eliminado

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total	
DOP-25	KG/CM2 H.O. DE 3.04 X1.18 MTS., CIMBRA COMÚN, ARMADA CON VAR#3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDDS, ENLADRILLADO CON LADRILLO ROJO DE AZOTEA DE 17X17 CM. VOLANDO 2 CM. DEL LADRILLO FUERA DE LA LOSA, LECHADEO CON CEMENTO-ARENA DE RIO SOBRE ENLADRILLADO, MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	07/03/2018	3.00	09/03/2018		0	\$7,050.65	\$7,050.65
	RESTAURACIÓN ELECTRICA DE CABLEADO DE TRANSFORMADOR HACIA MEDICIÓN CON 2 CABLES 4/0 DE COBRE CON UN DESARROLLO DE 4.00 MTS, INCLUYE: DESCONECXIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA ÁEREA EN POSTE DE C.F.E. CON PERDIGA, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES, ELEMENTOS DE PARA LA UNIÓN ENTRE CABLES, ENCINTADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.									

12. Eliminado

\$12,101.30
\$192,083.30

\$7,060.65
\$63,366.62

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018


PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NQ184 AB 100 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	07/03/2018	3.00	09/03/2018		□ \$8,462.69	\$8,462.69
DOP-27	SUSTRACCIÓN DE MOTOBOMBAS EN CUARTO DE MAQUINAS INUNDADO CON PERSONAL CALIFICADO EN FIN DE SEMANA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LA TUBERIA, DESCONEXIÓN DE LA LINEA ELECTRICA, DIAGNOSTICO DE LA MOTOBOMBA, COLOCACIÓN EN AREA PARA SU SECADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	07/02/2018	1.00	07/02/2018	1 \$1,152.57		\$1,152.57
Suma en la hoja:							\$1,152.57	\$8,462.69	
12. Eliminado							\$193,236.87	\$61,829.21	

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.


Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-28	SUSTRACCIÓN DE TIMER EN CUARTO DE MAQUINAS INUNDADO CON PERSONAL CALIFICADO EN FIN DE SEMANA, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LA TUBERIA ELECTRICA, DESCONEXIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO, DIAGNOSTICO DEL TIMER, COLOCACIÓN EN AREA PARA SU SECADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	07/02/2018	1.00	07/02/2018	\$953.76		\$953.76
DOP-29	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA EXISTENTE WISHPER FLO 2.5 HP, INCLUYE: CONECTOR 2" CED. 40, TUBO DE 2" PVC CED. 40, COPLER 2" CED. 40, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	07/03/2018	3.00	09/03/2018		\$2,252.07	\$2,252.07

12. Eliminado

\$953.76
\$194,189.63

\$2,252.07
\$64,081.28

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA. JALISCO.


Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-30	REVISION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN CUARTO DE BOMBAS INUNDAOO, INCLUYE: REVISIÓN DE TABLEROS Y GABINETES ELECTRICOS PARA EL RETIRO DE AGUA EXISTENTE EN SU INTERIOR, VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, REVISIÓN DE APAGADOR,CONTACTO Y BOMBAS PARA FILTROS, DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS, DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARA EL RETIRO DE AGUA DEL INTERIOR DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE TUBERIA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	10/03/2018	6.00	15/03/2018		□ \$2,319.80	\$2,319.80
DOP-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 AMP., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	6.00	15/03/2018	3.00	17/03/2018		□ \$3,695.70	\$3,695.70

Suma en la hoja: \$0.00 \$6,015.50
\$194,189.63 \$70,096.78

12. Eliminado

EZ RUIZ
LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES,
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.


Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA MCA. ALP LIGHTING MODELO F240/18, A PRUEBA DE POLVO Y AGUA EN GABINETE DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR IRROMPIBLE DE 1.27 MTS. DE LONGITUD PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W C/U. INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, TUBOS T-8 DE LED DE 18 WATTS MCA. PHILLIPS, BASES, DIFUSOR, CONEXIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	34.00	19/03/2018	3.00	21/03/2018		□ \$46,986.30	\$46,986.30

12. Eliminado

\$0.00 \$46,986.30
\$194,189.63 \$117,083.08

EZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN. DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MAGG PARA EXTERIOR EMPOTRABLE A PISO, MODELO L7311-914, EP 100 DUO DE 6W, IRC 93, 2700 K, 20°, ACERO INOXIDABLE, 50/60 HZ., 127-220V, 0.09 A, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	19/03/2018	3.00	21/03/2018		0 \$12,905.28	\$12,905.28
DOP-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SOPT DE EMPOTRAR DE 9 WATTS DIMEABLE DE LEDS, MCA. MAGG CTA. L5071-130, MODELO LUNA 9 SSD, A 127 VOLTS, 6,000 °K, 700 IM, IP 40, IR 0.82 PUDIENDO SER TAMBIEN DEL TIPO SOBREPONER CÍRCULAR, CUADRADA O SIMILAR, INLCUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	19/03/2018	3.00	21/03/2018		0 \$2,428.53	\$2,428.53

Suma en la hoja:

\$0.00 \$16,333.81
\$194,189.63 \$132,416.89

12. Eliminado

HEZ RUIZ
D LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-35	ENCOFRADO PARA TUBERIA ELECTRICA E HIDRAULICA CON UNA SECCIÓN DE 0.45 MTS. DE ANCHO X 0.35 ALTO ELABORADO DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 H.O., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	6.20	20/02/2018	9.00	28/02/2018	\$2,635.93		\$2,635.93
DOP-36	REFUERZO DE BANCOS DE SALIDA PARA CLAVADOS, INCLUYE: RETIRO DE SU UBICACIÓN ORIGINAL, CARGA Y ACARREO PARA TRASLADO A TALLER, DESMONTADO Y MONTADO DE PLACAS FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZAR LOS REFUERZOS, PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 X 22 CMS. T-304 DE PLACA DE 3/16" SOBRE LA PLACA DE FABRICA, TUBO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CMS. CALIBRE 18 T-304 PARA REFORZAR EL PELDAÑO INFERIOR DEL BANCO, 2 CARTABONES DE ACERO INOXIDABLE DE PLACA DE 3/16" DEBAJO DEL PELDAÑO INFERIOR DEL BANCO, 4	PZA	5.00	20/02/2018	7.00	26/02/2018	\$9,154.85		\$9,154.85

12. Eliminado

\$2,635.93
\$196,826.56

\$0.00
\$132,416.89

MEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
	CARTABONES DE ACERO INOXIDABLE DE PLACA DE 3/16" DEBAJO DEL PELDAÑO SUPERIOR DEL BANCO, CORTES CON GUILLOTINA PARA REALIZAR LOS CARTABONES, 4 BARRENOS SOBRE LA PLACA DE REFUERZO PARA CONECTAR EL BANCO AL ANCLAJE, SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308L DE UTP, PASTA DECAPANTE PARA LIMPIEZA DEL METAL TRABAJADO, BROCHA DE 3" PARA LA APLICACIÓN DE PASTA DECAPANTE EN EL AREA A LIMPIAR, 2 LTS. DE THINER PARA LIMPIEZA, EQUIPO DE ARGON PARA EL TRABAJO DE LA SOLDADURA DEL ACERO INOXIDABLE, PULIDORA CON DISCOS PARA AJUSTE DE PLACAS Y CARTABONES, LIMPIEZA DEL DECAPANTE CON HIDROLAVADORA Y 35 LTS. DE AGUA A PRECIÓN DE CADA ELEMENTO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.								

12. Eliminado

\$9,154.85
\$206,980.41

\$0.00
\$132,416.89

MEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
 INICIO: 07/02/2018
 TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
 LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
 C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
 Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
 BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
 RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
 GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO H.O. F'c= 150 KG/CM2, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN A 50 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ELABORACIÓN DE CONCRETO CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	M2	90.25	07/02/2018	14.00	20/02/2018	☐ \$21,319.76		\$21,319.76
DOP-38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM. DE PISO CERAMICO METALLIC II ZINC DE PRIMERA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ASENTADO SOBRE PEGAPISO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	26.89	21/02/2018	3.00	23/02/2018	☐ \$1,788.45		\$1,788.45

12. Eliminado

\$23,108.21
 \$229,088.62

\$0.00
 \$132,416.89

EZ RUIZ
 LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 55X55X40 CM. REFORZADO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE BASE DE LADRILLO DE LAMA 7X14X28 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4 CON DIMENCIÓN DE 60X60X50 CM., APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, EMBOQUILLADO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO ASTRATTO BLANCO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TIRATRIM EN LAS ESQUINAS, JUNTEO CON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DEL VERTEDERO, COLOCACIÓN DE CONTRACANASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	15/02/2018	6.00	20/02/2018	□ \$7,136.73		\$7,136.73

12. Eliminado

\$7,136.73
\$236,226.35

\$0.00
\$132,416.89

MEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA TIPO ESMERILADA SOBRE VIDRIO CLARO, INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RECORTES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	25.00	21/03/2018	2.00	22/03/2018		0 \$6,884.00	\$6,884.00
DOP-41	LIMPIEZA MANUAL DE VITROPISO, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA, RETIRO Y ACOPIO PRODUCTO DEL BARRIDO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, TRAPEADO Y SECADO DEL ÁREA, PORCENTAJE DE CUBETAS Y FRANELAS PARA LA LIMPIEZA, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	182.24	22/03/2018	2.00	23/03/2018		0 \$2,061.13	\$2,061.13


Suma en la hoja:

\$0.00
\$236,226.35

\$8,945.13
\$141,362.02

12. Eliminado

DEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-42	LIMPEZA MANUAL DE MUEBLES DE BAÑO, W.C., MINGITORIOS, LAVABOS, VERTEDEROS, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	23.00	22/03/2018	2.00	23/03/2018		0 \$405.72	\$405.72
DOP-43	LIMPIEZA MANUAL DE VIDRIOS A DOS CARAS, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	76.56	22/03/2018	2.00	23/03/2018		0 \$821.49	\$821.49
DOP-44	LIMPIEZA MANUAL AZULEJO, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	380.93	22/03/2018	2.00	23/03/2018		0 \$3,295.04	\$3,295.04


Suma en la hoja:

\$0.00
\$236,225.36

\$4,622.26
\$146,884.27

12. Eliminado

DEZ RUIZ
O LEGAL



PU

APERTURA: 19/01/2018
INICIO: 07/02/2018
TERMINO: 23/03/2018

PLANEACIÓN URBANA S.A. de C.V.
LA GIRALDA No. 120 COL. LOMA BONITA, GUADALAJARA JAL.
C. P. 45060 TEL. (33) 3630-29-13

GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
Adjudicación Directa No.: DOP-REH- MUN-PRO-AD-018-18

OBRA: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES.
BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN
RAFAEL SEGUNDA ETAPA. DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE
GUADALAJARA, JALISCO.

Programa general de ejecución de los trabajos DOCUMENTO 20


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	feb.-2018	mar.-2018	Total
DOP-45	LIMPIEZA MANUAL DE MAMPARAS CON AGUA Y JABÓN, INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y SECADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	44.13	22/03/2018	2.00	23/03/2018		0 \$358.34	\$358.34
DOP-46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO DE ALUMINIO 1/2" X 1 1/2" PARA VDLADOS DE EDIFICIO, INCLUYE: FIJACIÓN CON PIJAS PUNTA DE BROCA, APLICACIÓN DE ACRILASTIC BLANCO ENTRE EL ANGULO Y LA BOVEDA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	26.77	09/02/2018	4.00	12/02/2018	□ \$3,839.09		\$3,839.09


Total parcial: \$240,064.44 \$146,242.61
Total acumulado: \$240,064.44 \$386,307.05

\$3,839.09 \$358.34
\$240,064.44 \$146,242.61


12. Eliminado

EZ RUIZ
D LEGAL





Gestión Integral
de la Ciudad



Gobierno de
Guadalajara

ANEXO 2

NO. DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18

Los que firman este documento, relativo al contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, reconocen que se deriva de un procedimiento de los que contemplan los ordinales 43 puntos 1 y 2, 44, 49 punto 1, fracción I, 50 puntos 1 y 2, 81 punto 1 y 82 punto 1, del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, y por ende, se encuentra relacionado con el contrato, considerándose, **parte integral del mismo**. Igualmente, están de acuerdo que, en caso de disparidad o discrepancia entre la información contenida en este documento y la del contrato con el que se vincula, **se estarán a lo señalado en este documento**, lo que también ocurrirá, en caso de exceso, omisión o escasez de información en aquél, con la finalidad de que, fundamentalmente, el **CONTRATISTA**, no pueda evadir sus obligaciones contraídas, alegando disparidad de datos o información.

EL MUNICIPIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SINDICA MUNICIPAL

ANNÁ BARBARA CASILLAS GARCÍA

EL CONTRATISTA

12. Eliminado

Planeación Urbana S.A. de C.V.


TESTIGOS

TESORERA

Irlanda Baumbach
IRLANDA LORERYTHE BAUMBACH VALENCIA


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas
Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudad


JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA



Gobierno de
Guadalajara

La presente hoja de firmas, forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado, con número de contrato DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18, por **EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA** con Planeación Urbana S.A. de C.V. El día 6 de febrero de 2018, respecto de la obra: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLÁN, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.





 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:	19 de enero de 2018	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL		

12. Eliminado

CATALOGO DE CONC

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
EDIFICIO						
DOP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA REDDNO CHICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, CESPOL No. 207, EMPAQUE CHUPON DE NEOPRENO DE 2 1/4", EXTENSIÓN PARA LAVABO CROMADD DE 20 CM., SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	\$ 1,998.84	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.	\$15,989.12
DOP-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 610 MM. SATINADA, INCLUYE: CARGA Y ACRREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	4.00	\$ 907.01	NOVECIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$3,628.04
DOP-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 700 MM. SATINADA, INCLUYE: CARGA Y ACRREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	\$ 927.87	NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.	\$7,422.96
DOP-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO PARA WC DE PEDAL APARENTE ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 Ó 38 MM CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. 4.80 LITROS POR DESCARGA PRESIÓN REQUERIDA 1 KG/CM2., INCLUYE: MATEIRALES CONSUMIBLES, NIPLE GALV. 1" X 15CM., NIPLE GALV. 1" X 20CM., COPLE GALV. 1", REDUCCIÓN 1 1/4"-1", TUBO DE BRONCE CROMADO DE 1 1/4" PARA FLUXOMETRO, CHAPETON GDE PARA SPUD 38 MM., CR RF-278, CHAPETON 42 MM. PARA FLUXOMETRO DE PEDAL RF 813, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTD.	PZA	7.00	\$ 5,157.57	CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.	\$36,102.99





 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANOEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-05	ALIMENTACIÓN HIDRAULICA PARA RECUPERACIÓN DE AGUA HACIA VASO DE LA ALBERCA CON TUBERIA DE CPVC 3/4" CON UN DESARROLLO DE 6.60 MTS., INCLUYE: DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A LUGAR DE ACOPIO, CONEXIÓN DESDE LA TOMA DOMICILIARIA EN CISTERNA HACIA CUARTO DEL HIDRONEUMATICO CON 2 CODOS CPVC 3/4"X90°, 6.60 ML TUBERIA DE 3/4" DE CPVC, 1 TEE CPVC 3/4", 1 TAPON CPVC HEMBRA, 2 CONECTORES HEMBRA 3/4" CPVC, CUADRO GALVANIZADO PARA CONTROL DEL CIERRE Y APERTURA DEL AGUA POTABLE CON MATERIAL GALVANIZADO QUE CONSTA DE 1 TEE GALV. 3/4", 4 CODOS GALV. DE 3/4"X90°, 2 NIPLES GALV. 3/4"X12", 2 NIPLES GALV. 3/4"X6", 1 VALVULA ESFERA 3/4" . MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$ 2,800.21	DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 21/100 M.N.	\$2,800.21
DOP-06	INSTALACIÓN DE CERCACEL EXISTENTE PARA PROTECCIÓN Y RESGUARDO DE CALENTADORES SOLARES EN AZOTEA DE 9.35 X 3.95X 2.50 MTS., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DESDE EL SITIO DE SU ALMACENAMIENTO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACIÓN A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 300 MTS., COLOCACIÓN DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4" EN CADA POSTE (13 PZAS) . ELABORACIÓN DE PUERTA DE 0.85 X 2.30 MTS. CON PASADOR Y PORTA CANDADO, CANDADO PHILLIPS CON LLAVES, 15 ABRAZADERAS PARA CERCACEL, PINTURA ESMALTE BLANCO SOBRE CERCALCEL VERDE A DOS MANO Y DOS CARAS, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (66.40 M2)	PZA	1.00	\$ 9,559.13	NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.	\$9,559.13





 <p>Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: OOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-07	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN EXTERIOR PARA BODEGA DE 2.50 X 2.40 MTS. A OOS HOJAS ELABORAOA CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR OE 1 1/2" CONTRA-MARCO, REFUERZO CENTRAL OE CUAORAOO OE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL. 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO OE SU COLOCACIÓN, OETALLAOO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, GUARDAPOLVO, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO OE LA PUERTA, MATERIALRES CONSUMIBLES, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN OEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 9,712.05	NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 05/100 M.N.	\$29,136.15
OOP-08	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EXTERIOR DE 1.16 X 2.40MTS CON SOLERA 1 1/2" x 3/16" Y PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" ZETA PERSIANA CAL. 18 T CUADRADO DE 1/2" COMO REFUERZO EN "Z", INCLUYE CHAPA PHILLIPS725, DETALLAOO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA OE LAS UNIONES OE LAS Z PERSIANAS, , PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS OE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 OOS CARAS, GUARDAPOLVO, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR OEL MARCO OE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZAOA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$ 4,949.08	CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.	\$14,847.24




 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	12. Eliminado	

CATALOGO DE CONCE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-09	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS PARA VERTEDERO NIÑAS DE 1.15 X 2.80 MTS. CON FIJO SUPERIOR. ABATIBLE CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRAMARCO, REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.	\$ 7,042.06	\$7,042.06
DOP-10	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE A DOS HOJAS PARA VERTEDERO NIÑOS DE 1.43 X 2.80 MTS. CON FIJO SUPERIOR. ABATIBLE CON PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRAMARCO, REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA CAL 18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725, PICAPORTE PARA PISO Y CERRAMIENTO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, ACRISLACTIC BCO. EN EL PERIMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MARCO DE LA PUERTA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N.	\$ 7,307.78	\$7,307.78





 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:			
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE		

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TUBULAR DE 0.35X0.35X0.35 (04 PZAS) ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES A BASE DE TUBULAR DE 1"X1" CAL.18, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, 4 PATAS DE 0.35 MTS. CON TUBULAR DE 1"X1" CON SOLERA DE 2" X 10 CM., 8 TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4"X 1 1/2" X 1 PZAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$ 2,147.20	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	\$2,147.20
DOP-12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE 2.47 X 0.47 MTS CON PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" EN MARCO Y CONTRAMARCO CON ZETA PERSIANA CAL. 18 CON PORTA CANDADOS, INCLUYE: DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA DE LAS UNIONES DE LAS 2 PERSIANAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2.00	\$ 2,502.33	DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 33/100 M.N.	\$5,004.66
DOP-13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE 2.10 X 0.56 MTS CON PERFILES TUBULATES, PTR 1 1/2" x 3/16" EN MARCO Y CONTRAMARCO CON ZETA PERSIANA CAL. 18 CON PORTA CANDADOS, INCLUYE: DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNA DE LAS UNIONES DE LAS 2 PERSIANAS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	2.00	\$ 2,652.03	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.	\$5,304.06





 <p>GOBIERNO DE Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-14	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA CASETA DE HIDRONEUMÁTICO DE 1.42X3.35 A BASE DE PERFILES COMERCIALES Y ESTRUCTURALES, PTR DE 1 1/2" CONTRA-MARCO, TRASLAPE DE SOLERA DE 1 1/2". REFUERZO CENTRAL DE CUADRADO DE 1/2" Y ZETA PERSIANA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, FIJACIÓN EN PISO Y BOVEDA, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTIVA EN CADA UNIÓN DE LAS ZETAS PERSIANAS EN EL MARCO, CHAPA PHILLIPS 725 Y CANDADO, PICAPORTE PARA PISO Y BOVEDA, REPIZA DE LAMINA CAL 18 A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8", PUERTA SUPERIOR PARA REPIZA A BASE DE PTR 1 1/2" EN MARCO Y CONTRA-MARCO, ZETA PERSIANA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS Y CANDADO PHILLIPS CON DOS LLAVES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	\$ 10,151.52	\$10,151.52
DOP-15	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA CASETA DE BOMBAS DE CALOR DE 5.15 X 3.60 MTS. A UNA ALTURA DE 2.50 MTS. ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES A BASE ANGULO 1" X 1" X 3/16", REFUERZO DE PTR 2" X 2" CAL. 14 EN EL PERIMETRO DE LA REJA Y AL CENTRO DE LA MISMA, PARRILLA DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, PLACAS DE 5X12 CM. X 1/2" PARA SOPORTE DE LA REJA SOBRE POSTES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN, GRUA MANUAL PARA SU COLOCACIÓN, FONDO CON PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, PINTURA VERDE A DOS MANOS Y DOS CARAS, SOLDADURA, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 18,454.38	\$18,454.38





 Gobierno del Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-16	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOTILLA INGRESO HOMBRE PARA AZOTEA DE 0.70 X 1.40 MTS. ELABORADA A BASE DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL.14 EN MARCO Y HDJA CORREDIZA, GUIAS DE ANGULO DE 2" X 1/4", LAMINA LISA CAL. 18, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A SITIO DE SU COLOCACIÓN HASTA LA AZOTEA, PORTA CANDADO DE SOLERA DE 2", 1 CANDADO PHILLIPS CON LLAVES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,200.51	\$2,200.51
DOP-17	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINACO DE 1.45 X 1.65X 0.95 MTS. A BASE DE PTR DE 2"X2" BLANCO CAL. 12, CON SEIS PATAS DE 0.95 MTS. CON PLACAS DE 10X10 CM. EN CADA UNA DE ELLAS DE PLACA DE 1/2", ACERD DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO DE LOSA DE 5 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO H.O. FC= 150 KG/CM2, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.	\$ 5,713.30	\$5,713.30
DOP-18	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.07 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	\$ 2,749.24	\$2,749.24





 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-19	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.28 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.	\$ 2,206.88	\$2,206.88
DDP-20	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.20 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 35/100 M.N.	\$ 2,214.35	\$2,214.35
DOP-21	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 2.68 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	2.00	DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.	\$ 2,208.04	\$4,416.08




 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-22	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 0.49 X 3.31 MTS. PARA LINTERNILLA A BASE DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN A HASTA LA AZOTEA, CUADRICULA CON CUADRADO DE 1/2" @15 CM. ENTRE CADA UNA EN AMBOS SENTIDOS, FIJACIÓN CON TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8", SELLADO PERIMETRAL CON SILICON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DE LA REJA, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE FONDO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SAT VIVID V5 312-06 DOS CARAS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 17/100 M.N.	\$ 2,226.17		\$2,226.17
DOP-23	ELABORACIÓN DE LINTERNILLA A BASE DE MARCO DE PTR DE 3" X 3"X 3/16" DE 3.52 X 0.77 MTS. Y 8 PATAS DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" DE 1.05 MTS. FORMANDO 6 CLAROS PARA ALOJAR VENTANAS DE ALUMINIO ABATIBLES HACIA EL EXTERIOR Y DOS FIJOS LATERALES SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA HERRERIA, DEMOLICIÓN MANUAL EN BOVEDA PARA ANCLAR EN VIGUERIA CON SOLDADURA CADA UNA DE LAS PATAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO, RECIBIR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:5 CADA UNA DE LAS PATAS EN LA BOVEDA, LIMPIEZA CON THINER PARA ELIMINACIÓN DE POLVOS Y GRASAS EN EL PTR, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRIS MARTILLO COMEX 712 A DOS MANOS, LOSA DE 10 CM. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 H.O. DE 3.72 X1.18 MTS., CIMBRA COMÚN, ARMADO CON VAR#3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENLADRILLADO CON LADRILLO ROJO DE AZOTEA DE 17X17 CM. VOLANDO 2 CM. DEL LADRILLO FUERA DE LA LOSA, LECHADEO CON CEMENTO-ARENA DE RIO SOBRE ENLADRILLADO, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	pza	4.00	SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 46/100 M.N.	\$ 7,418.46		\$29,673.84





 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN. DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-24	ELABORACIÓN DE LINTERNILLA A BASE DE MARCO DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" DE 2.63 X 0.77 MTS. Y 6 PATAS DE PTR DE 3" X 3" X 3/16" DE 1.05 MTS. FORMANDO 4 CLAROS PARA ALOJAR VENTANAS DE ALUMINIO ABATIBLES HACIA EL EXTERIOR Y DOS FIJOS LATERALES SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA HERRERIA, DEMOLICIÓN MANUAL EN BOVEDA PARA ANCLAR EN VIGUERIA CON SOLDADURA CADA UNA DE LAS PATAS, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO, RECIBIR CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:5 CADA UNA DE LAS PATAS EN LA BOVEDA, LIMPIEZA CON THINER PARA ELIMINACIÓN DE POLVOS Y GRASAS EN EL PTR, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE GRIS MARTILLO COMEX 712 A DOS MANOS, LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 H.O. DE 3.04 X1.18 MTS., CIMBRA COMÚN, ARMADA CON VAR#3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENLADRILLADO CON LADRILLO ROJO DE AZOTEA DE 17X17 CM. VOLANDO 2 CM. DEL LADRILLO FUERA DE LA LOSA, LECHADEO CON CEMENTO-ARENA DE RIO SOBRE ENLADRILLADO, MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	pza	2.00	\$ 6,050.65	SEIS MIL CINCUENTA PESOS 65/100 M.N.	\$12,101.30
DOP-25	RESTAURACIÓN ELECTRICA DE CABLEADO DE TRANSFORMADOR HACIA MEDICIÓN CON 2 CABLES 4/0 DE COBRE CON UN DESARROLLO DE 4.00 MTS. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA ÁEREA EN POSTE DE C.F.E. CON PERDIGA, CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES, ELEMENTOS DE PARA LA UNIÓN ENTRE CABLES, ENCINTADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. INCLUYE: 8.00 CONECTOR A TOPE DESNUDO CAL. 4/0 TNA 711, 8.00 MANGA TERMOCONTRACTIL DE 4/0	PZA	1.00	\$ 7,050.65	SIETE MIL CINCUENTA PESOS 65/100 M.N.	\$7,050.65





 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	3 2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCE


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NQ184 AB 100 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X50 AMP. INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$ 8,462.69	OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	\$8,462.69
DOP-27	SUSTRACCIÓN DE MOTOBOMBAS EN CUARTO DE MAQUINAS INUNDADO CON PERSONAL CALIFICADO EN FIN DE SEMANA. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LA TUBERIA, DESCONEXIÓN DE LA LINEA ELECTRICA, DIAGNOSTICO DE LA MOTOBOMBA, COLOCACIÓN EN AREA PARA SU SECADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 384.19	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.	\$1,152.57
DOP-28	SUSTRACCIÓN DE TIMER EN CUARTO DE MAQUINAS INUNDADO CON PERSONAL CALIFICADO EN FIN DE SEMANA. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LA TUBERIA ELECTRICA, DESCONEXIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO, DIAGNOSTICO DEL TIMER, COLOCACIÓN EN AREA PARA SU SECADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 317.92	TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N.	\$953.76
DOP-29	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA EXISTENTE WISHPER FLO 2.5 HP. INCLUYE: CONECTOR 2" CED. 40, TUBO DE 2" PVC CEO. 40, COPLÉ 2" CED. 40, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 750.69	SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 M.N.	\$2,252.07




 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	>2018 LICITANTE	
	CATALOGO DE CONCI			

12. Eliminado

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-30	REVISION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN CUARTO DE BOMBAS INUNDADO, INCLUYE: REVISIÓN DE TABLEROS Y GABINETES ELECTRICOS PARA EL RETIRO DE AGUA EXISTENTE EN SU INTERIOR, VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, REVISIÓN DE APAGADOR, CONTACTO Y BOMBAS PARA FILTROS, DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS, DESMONTAJE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARA EL RETIRO DE AGUA DEL INTERIOR DE LA MISMA, COLOCACIÓN DE TUBERIA, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1.00	\$ 2,319.80	DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.	\$2,319.80
DOP-31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 AMP., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	6.00	\$ 615.95	SEISCIENTOS QUINCE PESOS 95/100 M.N.	\$3,695.70
DOP-32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA MCA. ALP LIGHTING MODELO F240/18, A PRUEBA DE POLVO Y AGUA EN GABINETE DE POLIMERO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y DIFUSOR IRROMPIBLE DE 1.27 MTS. DE LONGITUD PARA ALOJAR 2 TUBOS DE LED DE 18 W C/U. INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU INSTALACIÓN, ANDAMIOS, TUBOS T-8 DE LED DE 18 WATTS MCA. PHILLIPS, BASES, DIFUSOR, CONEXIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	34.00	\$ 1,381.95	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$46,986.30
DOP-33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MAGG PARA EXTERIOR EMPOTRABLE A PISO, MODELO L7311-914, EP 100 DUO DE 6W, IRC 93, 2700 K, 20°, ACERO INOXIDABLE, 50/60 HZ., 127-220V, 0.09 A. INCLUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	8.00	\$ 1,613.16	UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.	\$12,905.28





 Gobierno de Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	e 2018 . LICITANTE	

12. Eliminado

CÁLOGO DE CONCI

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT SOPT DE EMPOTRAR DE 9 WATTS DIMEABLE DE LEDS, MCA. MAGG CTA. L5071-130, MODELO LUNA 9 SSD, A 127 VOLTS, 6,000 °K, 700 IM, IP 40, IR 0.82 PUDIENDO SER TAMBIEN DEL TIPO SOBREPONER CIRCULAR, CUADRADA O SIMILAR, INLCUYE: CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 809.51	OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 51/100 M.N.	\$2,428.53
DOP-35	ENCOFRADO PARA TUBERIA ELECTRICA E HIDRAULICA CON UNA SECCIÓN DE 0.45 MTS. DE ANCHO X 0.35 ALTO ELABORADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 H.O., INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	6.20	\$ 425.15	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N.	\$2,635.93




 <p>Gobierno de Guadalajara</p>	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	e 2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONC

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CONTINÚO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-36	REFUERZO DE BANCOS DE SALIDA PARA CLAVADOS, INCLUYE: RETIRO DE SU UBICACIÓN ORIGINAL, CARGA Y ACARREO PARA TRASLADO A TALLER, DESMONTADO Y MONTADO DE PLACAS FIBRA DE VIDRIO PARA REALIZAR LOS REFUERZOS, PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 X 22 CMS. T-304 DE PLACA DE 3/16" SOBRE LA PLACA DE FABRICA, TUBO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE DE 30 CMS. CALIBRE 18 T-304 PARA REFORZAR EL PELDAÑO INFERIOR DEL BANCO, 2 CARTABONES DE ACERO INOXIDABLE DE PLACA DE 3/16" DEBAJO DEL PELDAÑO INFERIOR DEL BANCO, 4 CARTABONES DE ACERO INOXIDABLE DE PLACA DE 3/16" DEBAJO DEL PELDAÑO SUPERIOR DEL BANCO, CORTES CON GUILLOTINA PARA REALIZAR LOS CARTABONES, 4 BARRENOS SOBRE LA PLACA DE REFUERZO PARA CONECTAR EL BANCO AL ANCLAJE, SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308L DE UTP, PASTA DECAPANTE PARA LIMPIEZA DEL METAL TRABAJADO, BROCHA DE 3" PARA LA APLICACIÓN DE PASTA DECAPANTE EN EL AREA A LIMPIAR, 2 LTS. DE THINER PARA LIMPIEZA, EQUIPO DE ARGON PARA EL TRABAJO DE LA SOLDADURA DEL ACERO INOXIDABLE, PULIDORA CON DISCOS PARA AJUSTE DE PLACAS Y CARTABONES, LIMPIEZA DEL DECAPANTE CON HIDROLAVADORA Y 35 LTS. DE AGUA A PRECIÓN DE CADA ELEMENTO, MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	5.00	\$ 1,830.97	UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 97/100 M.N.	\$9,154.85
DOP-37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO H.O. F'c= 150 KG/CM2, 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN A 50 MTS. DE DISTANCIA, COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ELABORACIÓN DE CONCRETO CON REVOLVEDORA DE 1 SACO, DESPERDICIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	M2	90.25	\$ 236.23	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.	\$21,319.76





Gobierno de
Guadalajara

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.

FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales
FECHA DE PRESENTACIÓN:

DOCUMENTO 11


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.


L.C.P. GABRIEL HERNÁNDEZ
APODERADO LEGAL

12. Eliminado

CATALOGO DE C

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) CON NÚMERO	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM. DE PISO CERAMICO METALLIC II ZINC DE PRIMERA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, ASENTADO SOBRE PEGAPISO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	26.89	\$ 66.51	SESENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$1,788.45
DOP-39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 55X55X40 CM. REFORZADO, INCLUYE: ELABORACIÓN DE BASE DE LADRILLO DE LAMA 7X14X28 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4 CON DIMENCIÓN DE 60X60X50 CM., APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, EMBOQUILLADO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO ASTRATTO BLANCO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, TIRATRIM EN LAS ESQUINAS, JUNTEO CON ACRILASTIC BLANCO EN TODO EL PERIMETRO DEL VERTEDERO, COLOCACIÓN DE CONTRACANASTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3.00	\$ 2,378.91	DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.	\$7,136.73
DOP-40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA TIPO ESMERILADA SOBRE VIDRIO CLARO, INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA, RECORTES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	25.00	\$ 275.36	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.	\$6,884.00
DOP-41	LIMPIEZA MANUAL DE VITROPISO, INCLUYE: BARRIDO DEL ÁREA, RETIRO Y ACOPIO PRODUCTO DEL BARRIDO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, TRAPEADO Y SECADO DEL ÁREA, PORCENTAJE DE CUBETAS Y FRANELAS PARA LA LIMPIEZA, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	182.24	\$ 11.31	ONCE PESOS 31/100 M.N.	\$2,061.13
DOP-42	LIMPEZA MANUAL DE MUEBLES DE BAÑO, W.C., MINGITORIOS, LAVABOS, VERTEDEROS, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	23.00	\$ 17.64	DIECISIETE PESOS 64/100 M.N.	\$405.72




 Guadalajara	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONTRATO: DOP-REH-MUN-PRO-AD-018-18		DOCUMENTO 11
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: TRABAJOS ADICIONALES A LOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTIDORES, BOMBAS DE CALOR PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE SAN RAFAEL SEGUNDA ETAPA, DE LA ZONA 6 TETLAN, DEL MUNICIPIO DE DE GUADALAJARA, JALISCO.	FECHA DE INICIO: 7 de febrero de 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de marzo de 2018 PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales FECHA DE PRESENTACIÓN:		
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PLANEACIÓN URBANA, S.A. DE C.V.	L.C.P. GABRIEL HERNANDEZ APODERADO LEGAL	e 2018 LICITANTE	

12. Eliminado

CATALOGO DE CONCI

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO (\$) CON LETRA	IMPORTE (\$) M.N.
DOP-43	LIMPIEZA MANUAL DE VIDRIOS A DOS CARAS, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	76.56	\$ 10.73	DIEZ PESOS 73/100 M.N.	\$821.49
DOP-44	LIMPIEZA MANUAL AZULEJO, INCLUYE: CUBETAS, FRANELAS, DETERGENTE, AGUA, CLORO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	380.93	\$ 8.65	OCHO PESOS 85/100 M.N	\$3,295.04
DOP-45	LIMPIEZA MANUAL DE MAMPARAS CON AGUA Y JABÓN, INCLUYE: MATERIALES CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y SECADO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	M2	44.13	\$8.12	OCHO PESOS 12/100 M.N.	\$358.34
DOP-46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO DE ALUMINIO 1/2" X 1 1/2" PARA VOLADOS DE EDIFICIO, INCLUYE: FIJACIÓN CON PIJAS PUNTA DE BROCA, APLICACIÓN DE ACRILASTIC BLANCO ENTRE EL ANGULO Y LA BOVEDA, MATERIALES CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	ML	26.77	\$143.41	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	\$3,839.09

IMPORTE TOTAL CON LETRA	Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Dieciseis Pesos 18/100 M.N.	SUB-TOTAL \$	386,307.05
		16% I.V.A. \$	61,809.13
		GRAN TOTAL \$	448,116.18



ÍNDICE DE DATOS PERSONALES

DATO ELIMINADO:

Número	Dato personal	Motivación y Fundamento
1	Nacionalidad	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
2	Edad	
3	Sexo	
4	Fecha de nacimiento	
5	Lugar de Nacimiento	
6	Domicilio Particular	
7	Correo electrónico particular	
8	Teléfono/ celular particular	
9	Número de folio y/o clave de elector de credencial de elector	
10	Número de identificación oficial diversa	
11	Estado Civil	
12	Firma del particular	
13	Fotografía	
14	Fecha de nacimiento en la CURP	
15	Fecha de nacimiento en el RFC	
16	Número de cuenta bancaria	
17	Parentesco	
18	Nombre de familiares o dependientes económicos	
19	Grado académico (no aplica a servidores públicos)	
20	Huellas digitales	
21	Estado de Salud	
22	Tratamiento médico	
23	Preferencia sexual	
24	Religión	
25	Ideología Política	
26	Activos, pasivos y/o gravámenes	
27	Afiliación sindical	
28	Entregada con el carácter de confidencial	Art. 21.1.II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
29	La así dispuesta por otra normatividad	Art. 21.1.III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
30	Nombre relacionado con otro dato personal	<p>Evidenciar dicho dato permitiría determinar la identidad de una persona física.</p> <p>Art. 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.</p>
